

SCHÉMA UNIFILAIRE — ÉTAT EXISTANT

Relevé des tableaux électriques existants — du comptage Enedis aux tableaux divisionnaires

Affaire

Caractéristiques générales relevées

Maître d'ouvrage	AKPINAR YUNUS
Adresse	8 rue Fingues — 33310 LORMONT — France
Contact	akpinar.yunus@outlook.fr
Nom du projet	Relevé tableaux électriques — état existant
Version	1.0
Date	31.08.2026
Origine des données	Relevé photographique de l'existant

Origine	Réseau public BT Enedis — comptage indirect probable sur TC
Comptage	Itron ACE6000 — 3 × 230/400 V — 50 Hz — télérelève ACTIA
Disjoncteur d'abonné	Merlin Gerin Compact NS160N + STR AB 160 + Vigì MH
Réglage I _r apparent	≈ 110 A (page 90-160 A) — à confirmer
Sensibilité Vigì MH	0,3 A apparent — à confirmer
Régime de neutre	À confirmer
I _{cc} réel aux tableaux	À confirmer


Ensembles documentés

N°	Ensemble	Enveloppe	Réseau	Coupure générale locale	Fiabilité
1	TGBT	Armoire modulaire Merlin Gerin, 4 rangées	3P+N probable	Non — NS160N déporté au comptage	Probable
2	TD entrepôt — bât. annexe	Armoire Schneider récente, 3 rangées	3P+N	IG Acti9 iSW-NA 4P 63 A	Confirmé
3	TDS prises entrepôt	Coffret étanche, 1 rangée	3P+N probable	Non visible — ID1 4P 40 A 30 mA	Confirmé
4	TD rideaux hangar	Coffret étanche gris, 2 rangées	Tri probable	Non visible	Probable
5	TD hangar — bât. annexe	Grande armoire métallique ancienne	3P+N probable	Non identifiée	À confirmer
6	TD établi	Coffret modulaire blanc Schneider, 1 rangée	Tri + mono	Non visible	À confirmer
7	TD 138601-ELE-ARDV-0003	Armoire métallique murale — baie info + onduleur	230 V (2P)	ID K 2P 40 A 30 mA	Probable
8	Disjoncteur d'abonné	Appareil mural déporté — Compact NS160N	4P	Oui — STR AB 160 + Vigì MH	Confirmé
9	Comptage Enedis/ERDF	Panneau scellé — Itron ACE6000 + ACTIA	3 × 230/400 V	Sans objet	Confirmé

Limites du document

- Document de relevé de l'état existant : ni étude de conformité, ni optimisation, ni dossier de dimensionnement.
- La position physique des appareils dans les tableaux ne prouve pas leur raccordement électrique.
- Liaisons internes, sections, longueurs, régimes de neutre et courants de court-circuit non visibles sur les photographies.
- Toute liaison seulement probable est tracée en pointillé ; toute donnée non confirmée est annotée « à confirmer » en rouge.

RELEVÉ DE L'ÉTAT EXISTANT Schéma unifilaire — sans étude de conformité ni dimensionnement	Relevé tableaux électriques — état existant	Page de garde	Version: 1.0	31.08.2026 (DD.MM.YYYY)	
--	---	---------------	--------------	----------------------------	--

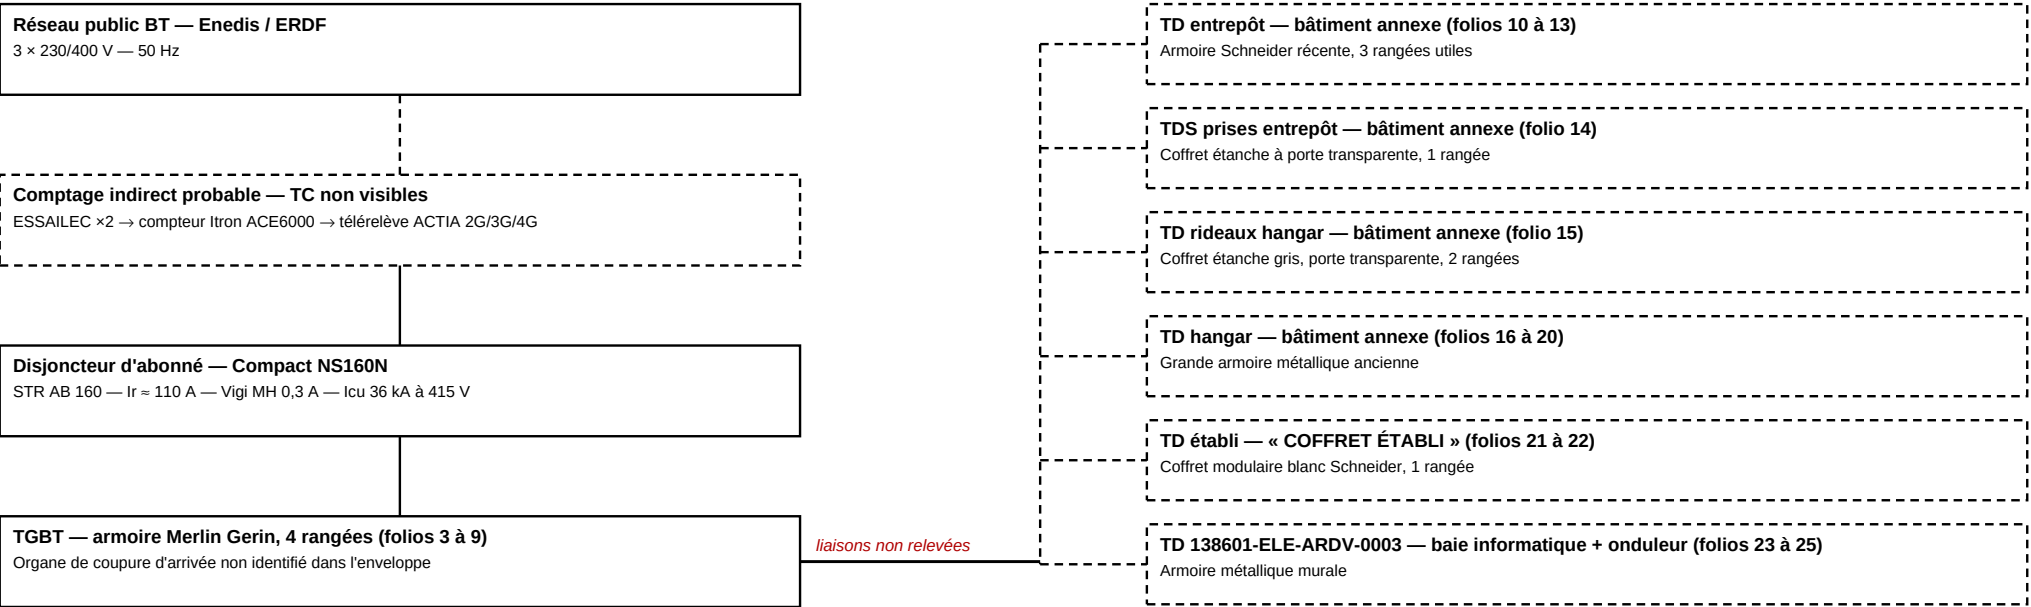


Limite — le compteur peut être en mesure indirecte : les conducteurs de puissance ne traversent alors pas directement le compteur. Les TC et leur rapport ne sont pas visibles.

Les liaisons TGBT → tableaux divisionnaires sont tracées en pointillé : cheminement, sections et protections de départ ne sont pas démontrés par le relevé photographique.

RELEVÉ DE L'ÉTAT EXISTANT Schéma unifilaire — sans étude de conformité ni dimensionnement	Relevé tableaux électriques — état existant	Synoptique général	Version: 1.0	31.08.2026 (DD.MM.YYYY)	1 / 26
---	--	-------------------------------	-------------------------	--	-------------------

ORIGINE DE L'INSTALLATION

Comptage Enedis et disjoncteur d'abonné

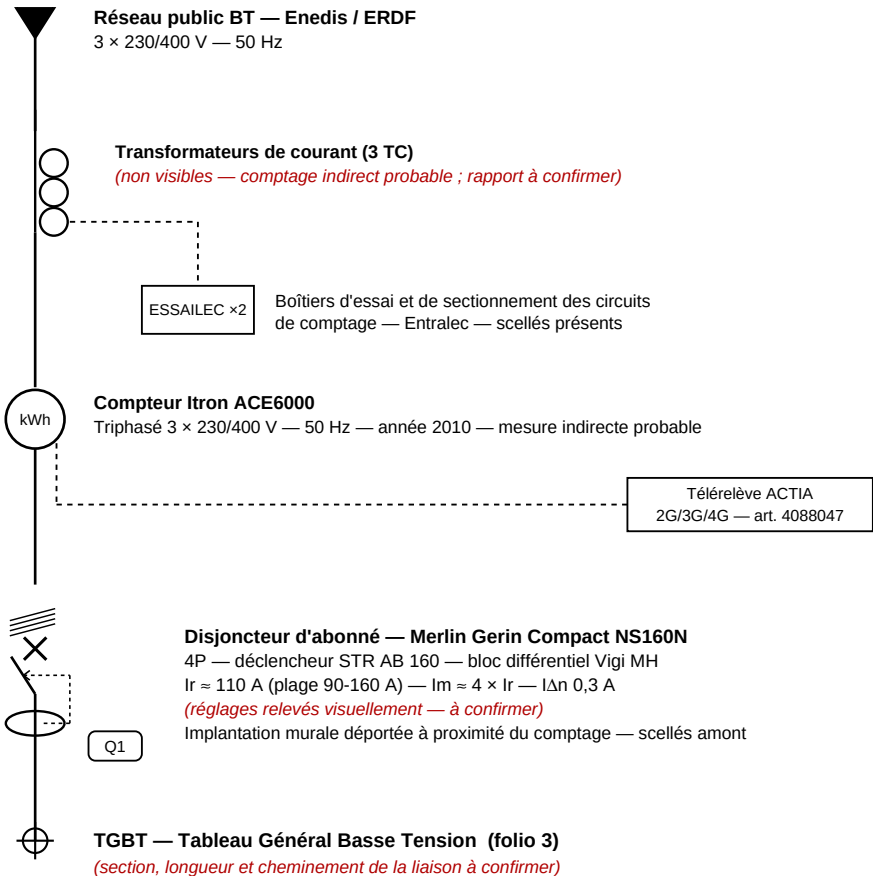

Plaque NS160N — pouvoir de coupure

Ui	750 V
Uimp	8 kV
Norme	IEC 947-2 — catégorie A
Ics	100 % Icu
Icu 220/240 V	85 kA
Icu 380/415 V	36 kA
Icu 440 V	35 kA
Icu 500 V	30 kA
Icu 525 V	22 kA
Icu 660/690 V	8 kA
Icu 250 V DC	50 kA

Réglages et commandes relevés

STR AB 160 — Ir	Plage 90 à 160 A
Réglage Ir apparent	≈ 110 A — à confirmer
Réglage Im apparent	≈ 4 × Ir — à confirmer
Vigì MH — IΔn	0,3 A apparent — à confirmer
Vigì MH — temporisation	Réglable — position à confirmer
Commandes Vigì	T = test ; R = réarmement
Commande mécanique	Bouton rouge push-to-trip

Attention — 36 kA est le pouvoir de coupure Icu du NS160N à 380/415 V, et non l'Icc réel de l'installation, qui reste à déterminer.

RELEVÉ DE L'ÉTAT EXISTANT

Schéma unifilaire — sans étude de conformité ni dimensionnement

Relevé tableaux électriques — état existant

Origine — comptage et disjoncteur d'abonné

Version: 1.0

31.08.2026
(DD.MM.YYYY)

2 / 26

- Légende
- Q- Dispositifs de protection
 - I- Interrupteurs
 - X- Autres appareils
 - ⊕ Tableau raccordé aux borniers
 - - - Liaison probable — à confirmer sur site
 - Rouge : donnée non confirmée par le relevé

TGBT

Tableau Général Basse Tension

Enveloppe : Armoire modulaire ancienne, marque Merlin Gerin

Rangées : 4 rangées utiles ; 1re rangée obturée

Réseau : Triphasé + neutre (probable)

Icc : À confirmer


Régime de neutre : À confirmer

Parafoudre : Aucun appareil identifiable

Observations


- Disjoncteur général non intégré à l'enveloppe : Compact NS160N + Vigi MH déporté près du comptage (folio 2).
- Câblage interne non visible : aucune liaison interne n'est démontrée.

Alerte de schéma — la répartition D1-D5 sous DF1, D7-D11 sous DF2 et D13-D17 sous DF3 est cohérente visuellement mais le câblage n'est pas visible. Ces liaisons sont tracées en pointillé et restent à confirmer sur site.

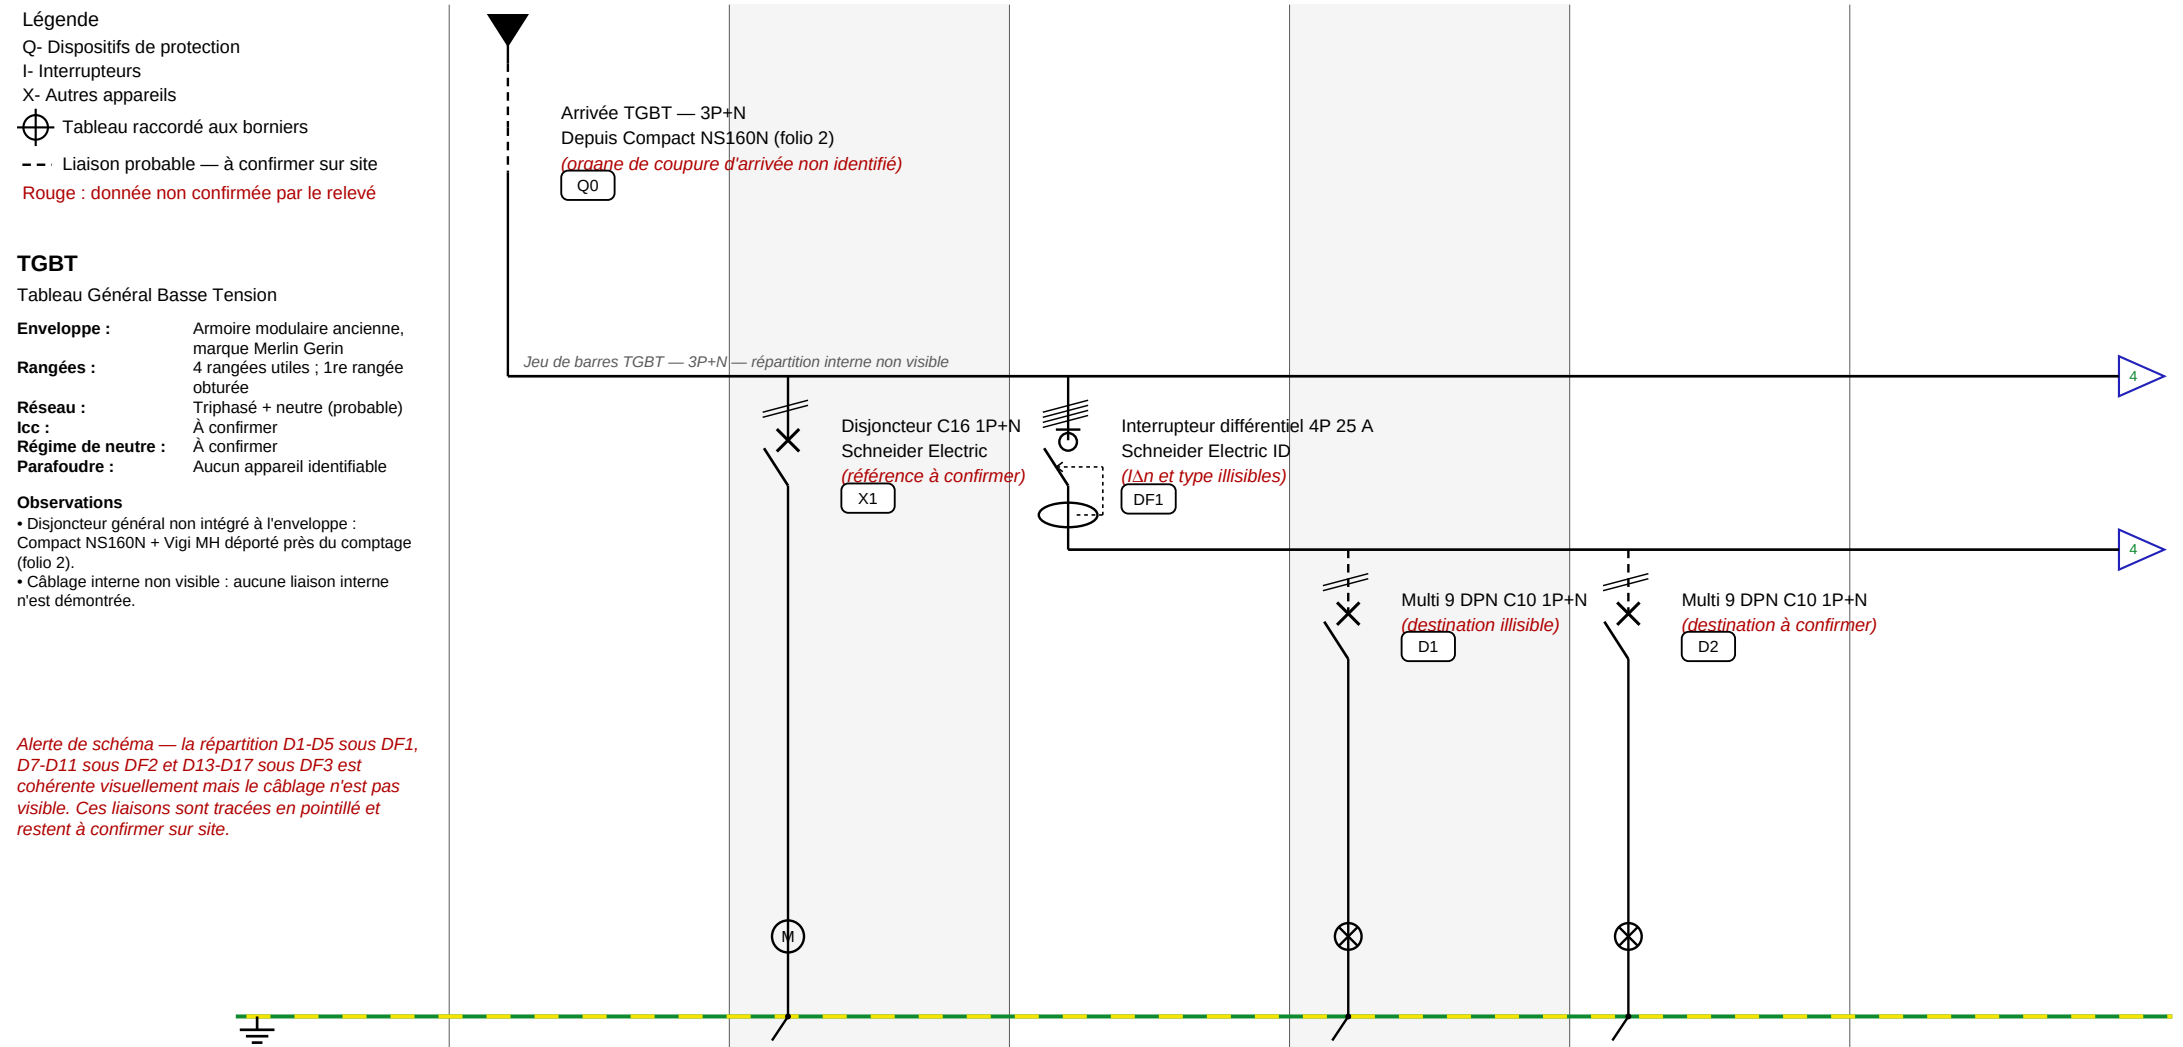


Identification du circuit	Q0	X1	DF1	D1	D2
Désignation	Arrivée depuis disjoncteur d'abonné	Porte automatique	Général éclairage	Destination manuscrite illisible	Vestiaire (probable)
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	Non identifié	Schneider Electric	Schneider ID	Multi 9 DPN	Multi 9 DPN
Fiabilité du relevé	À confirmer	Probable	Probable	À confirmer	À confirmer


RELEVÉ DE L'ÉTAT EXISTANT Schéma unifilaire — sans étude de conformité ni dimensionnement	Relevé tableaux électriques — état existant	Tableau Général Basse Tension	Version: 1.0	31.08.2026 (DD.MM.YYYY)	3 / 26
---	---	-------------------------------	--------------	----------------------------	--------

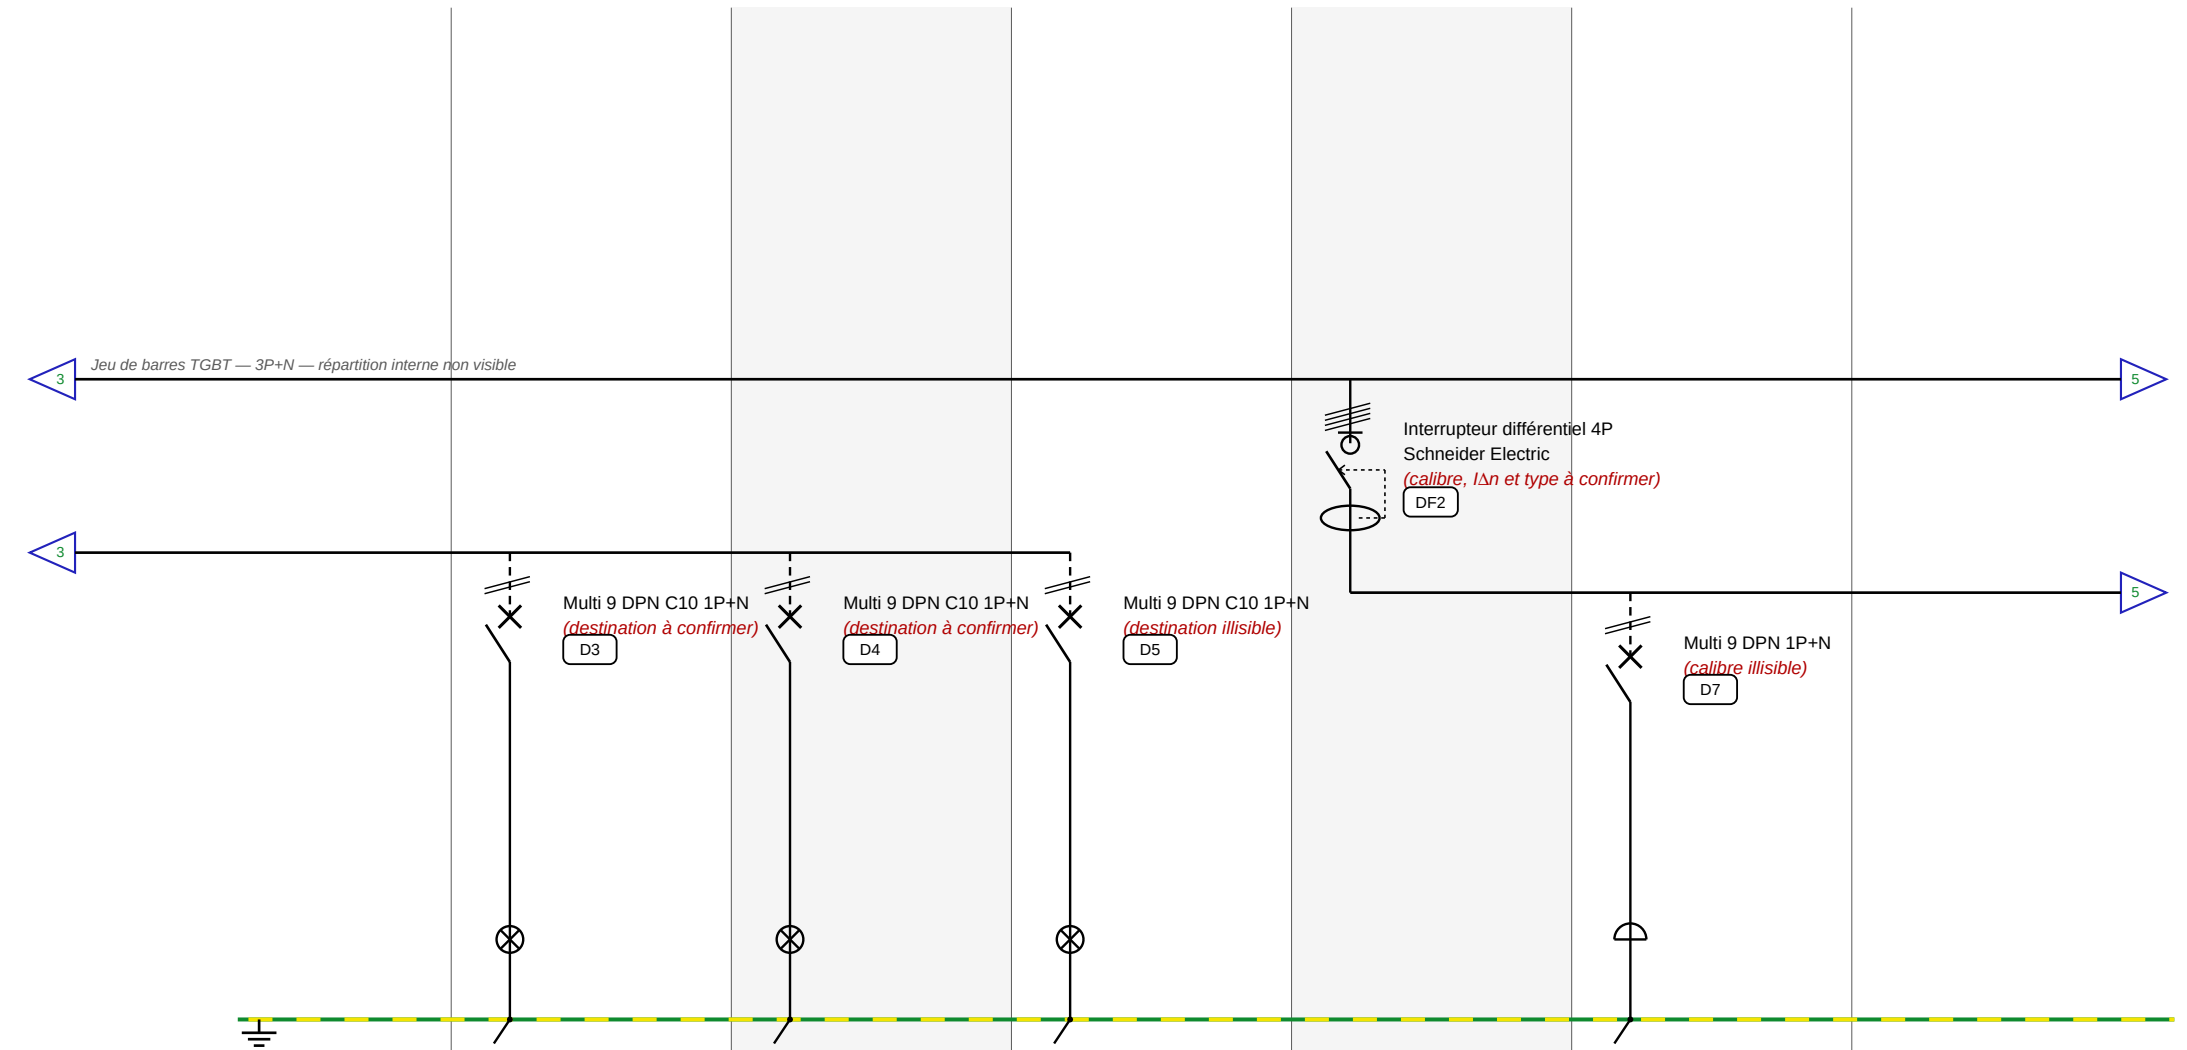


Identification du circuit	D3	D4	D5	DF2	D7
Désignation	Extérieur (probable)	Cuisine (probable)	Destination non exploitable	Général PC 1	Prises de courant
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	Multi 9 DPN	Multi 9 DPN	Multi 9 DPN	Schneider ID	Multi 9 DPN
Fiabilité du relevé	À confirmer	À confirmer	À confirmer	À confirmer	À confirmer

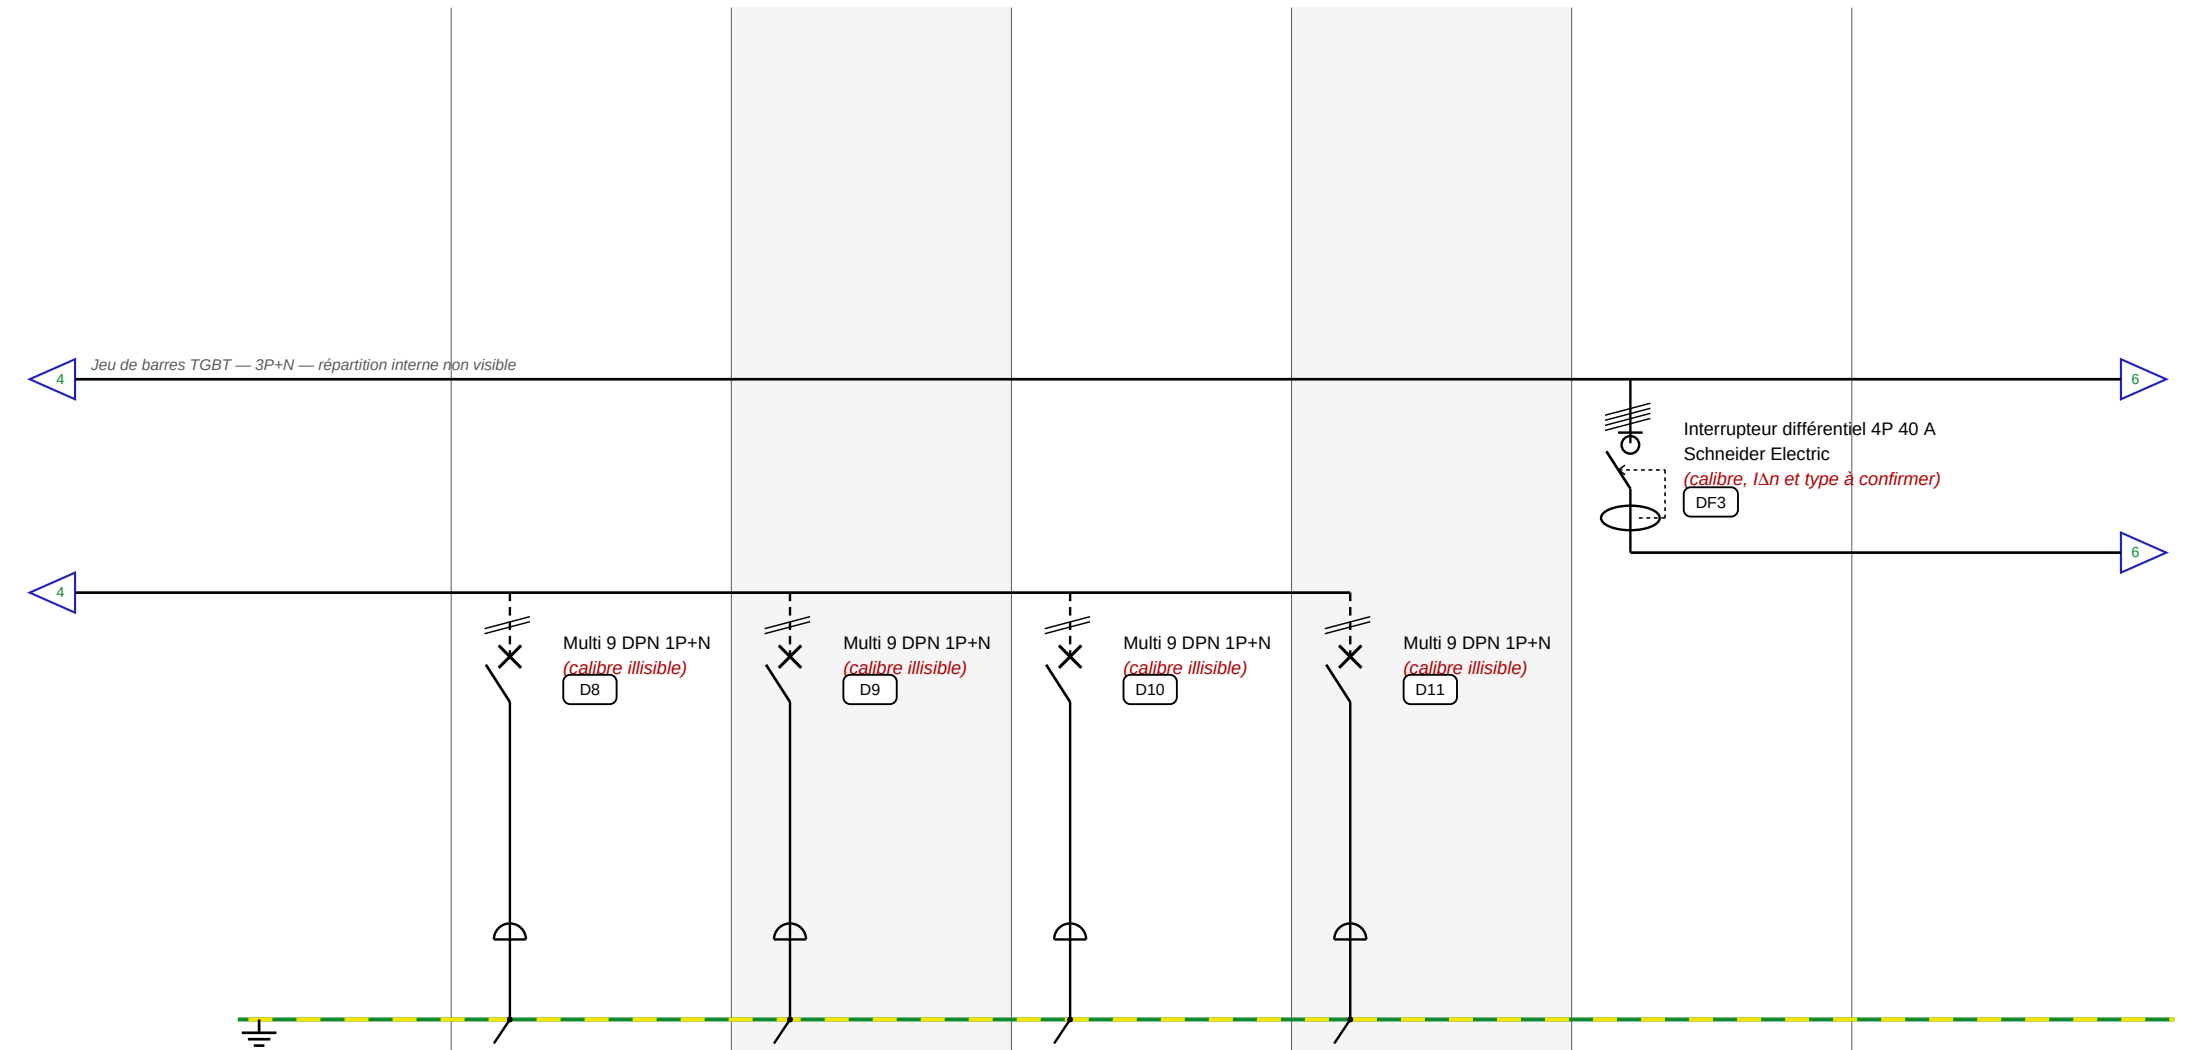

Identification du circuit	D8	D9	D10	D11	DF3
Désignation	Prises de courant	Prises de courant	Prise cuisine (probable)	Destination partiellement lisible	Général PC 2
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	Multi 9 DPN	Multi 9 DPN	Multi 9 DPN	Multi 9 DPN	Schneider ID
Fiabilité du relevé	À confirmer	À confirmer	À confirmer	À confirmer	À confirmer

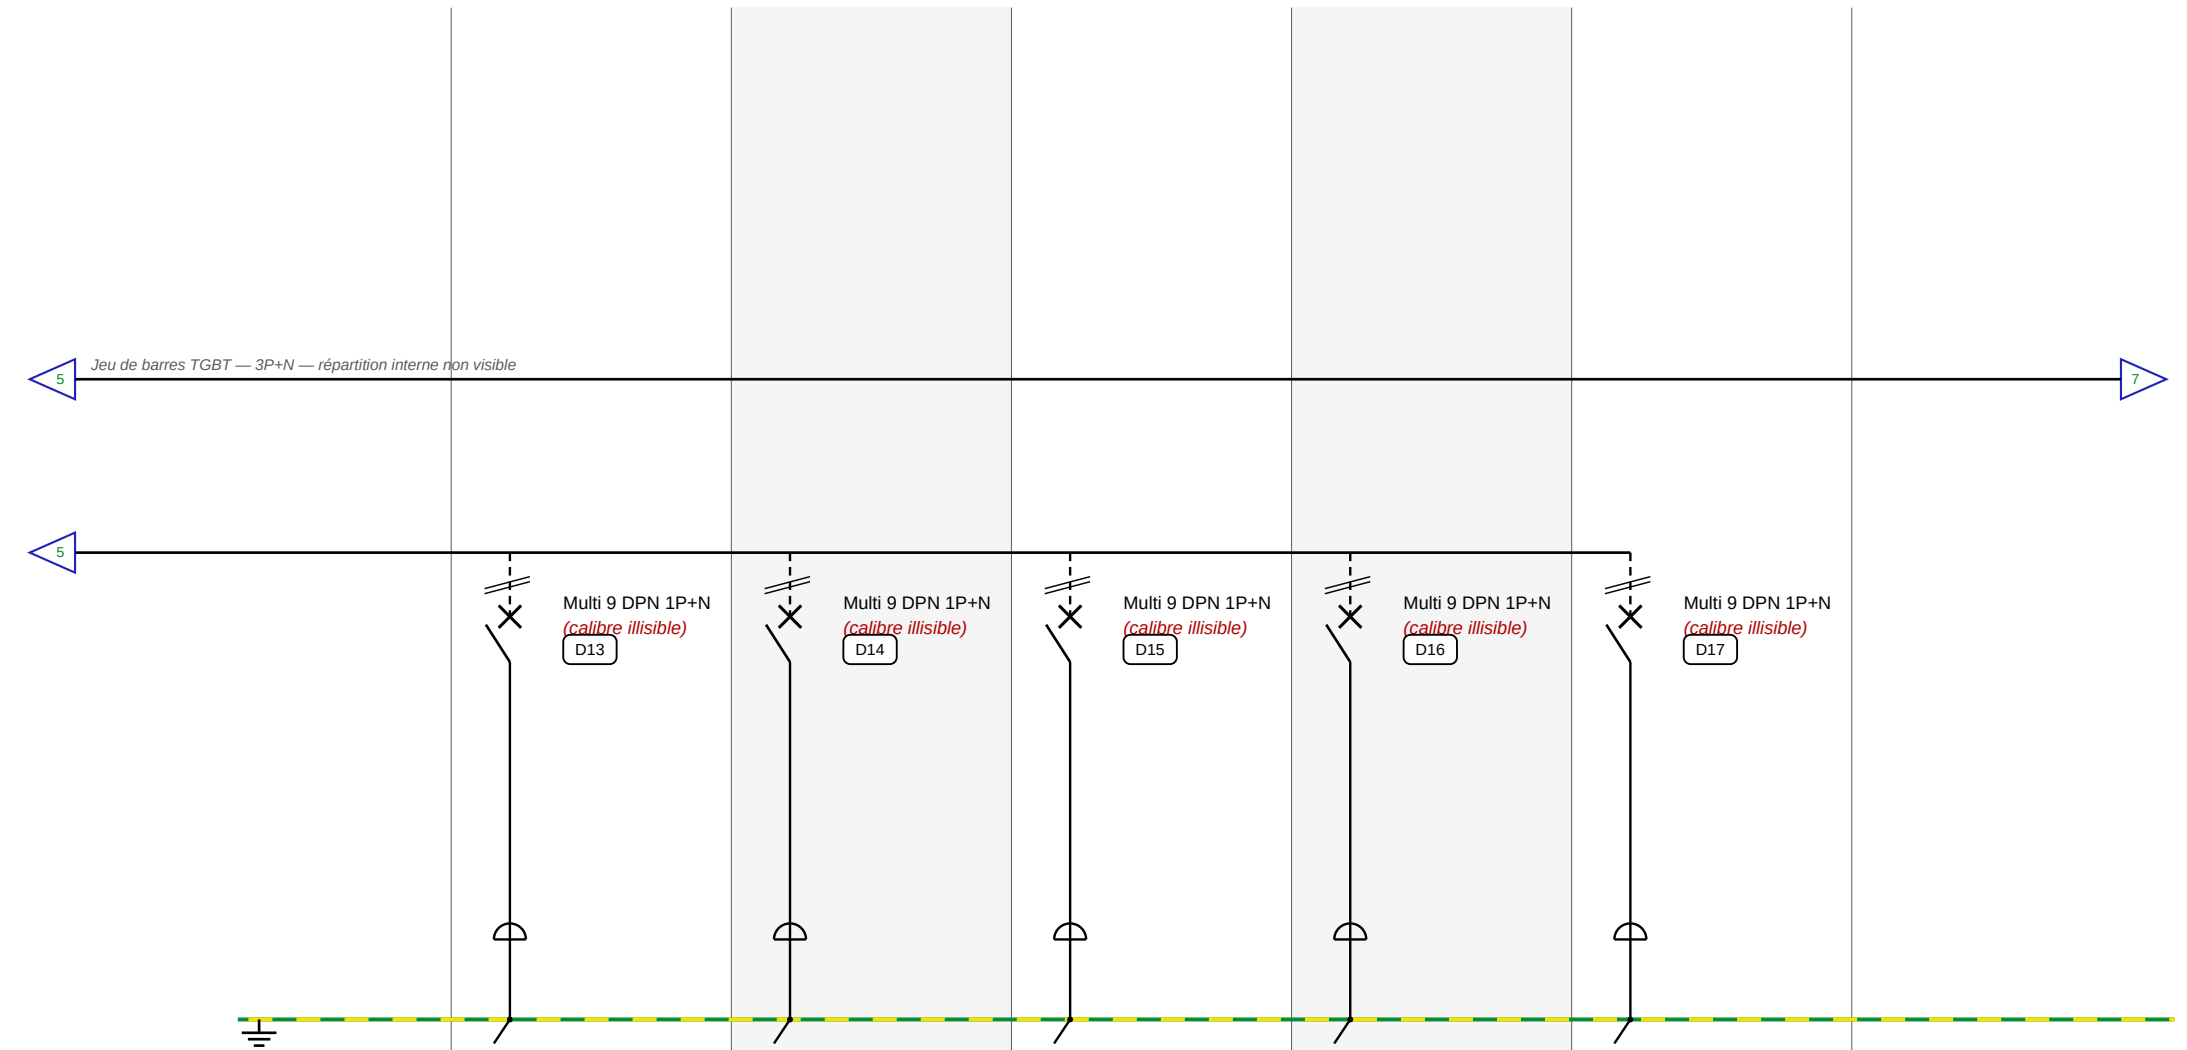


Identification du circuit	D13	D14	D15	D16	D17
Désignation	Prises de courant	Prises de courant	Prises de courant	Prises de courant	Prises de courant
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	Multi 9 DPN	Multi 9 DPN	Multi 9 DPN	Multi 9 DPN	Multi 9 DPN
Fiabilité du relevé	À confirmer	À confirmer	À confirmer	À confirmer	À confirmer

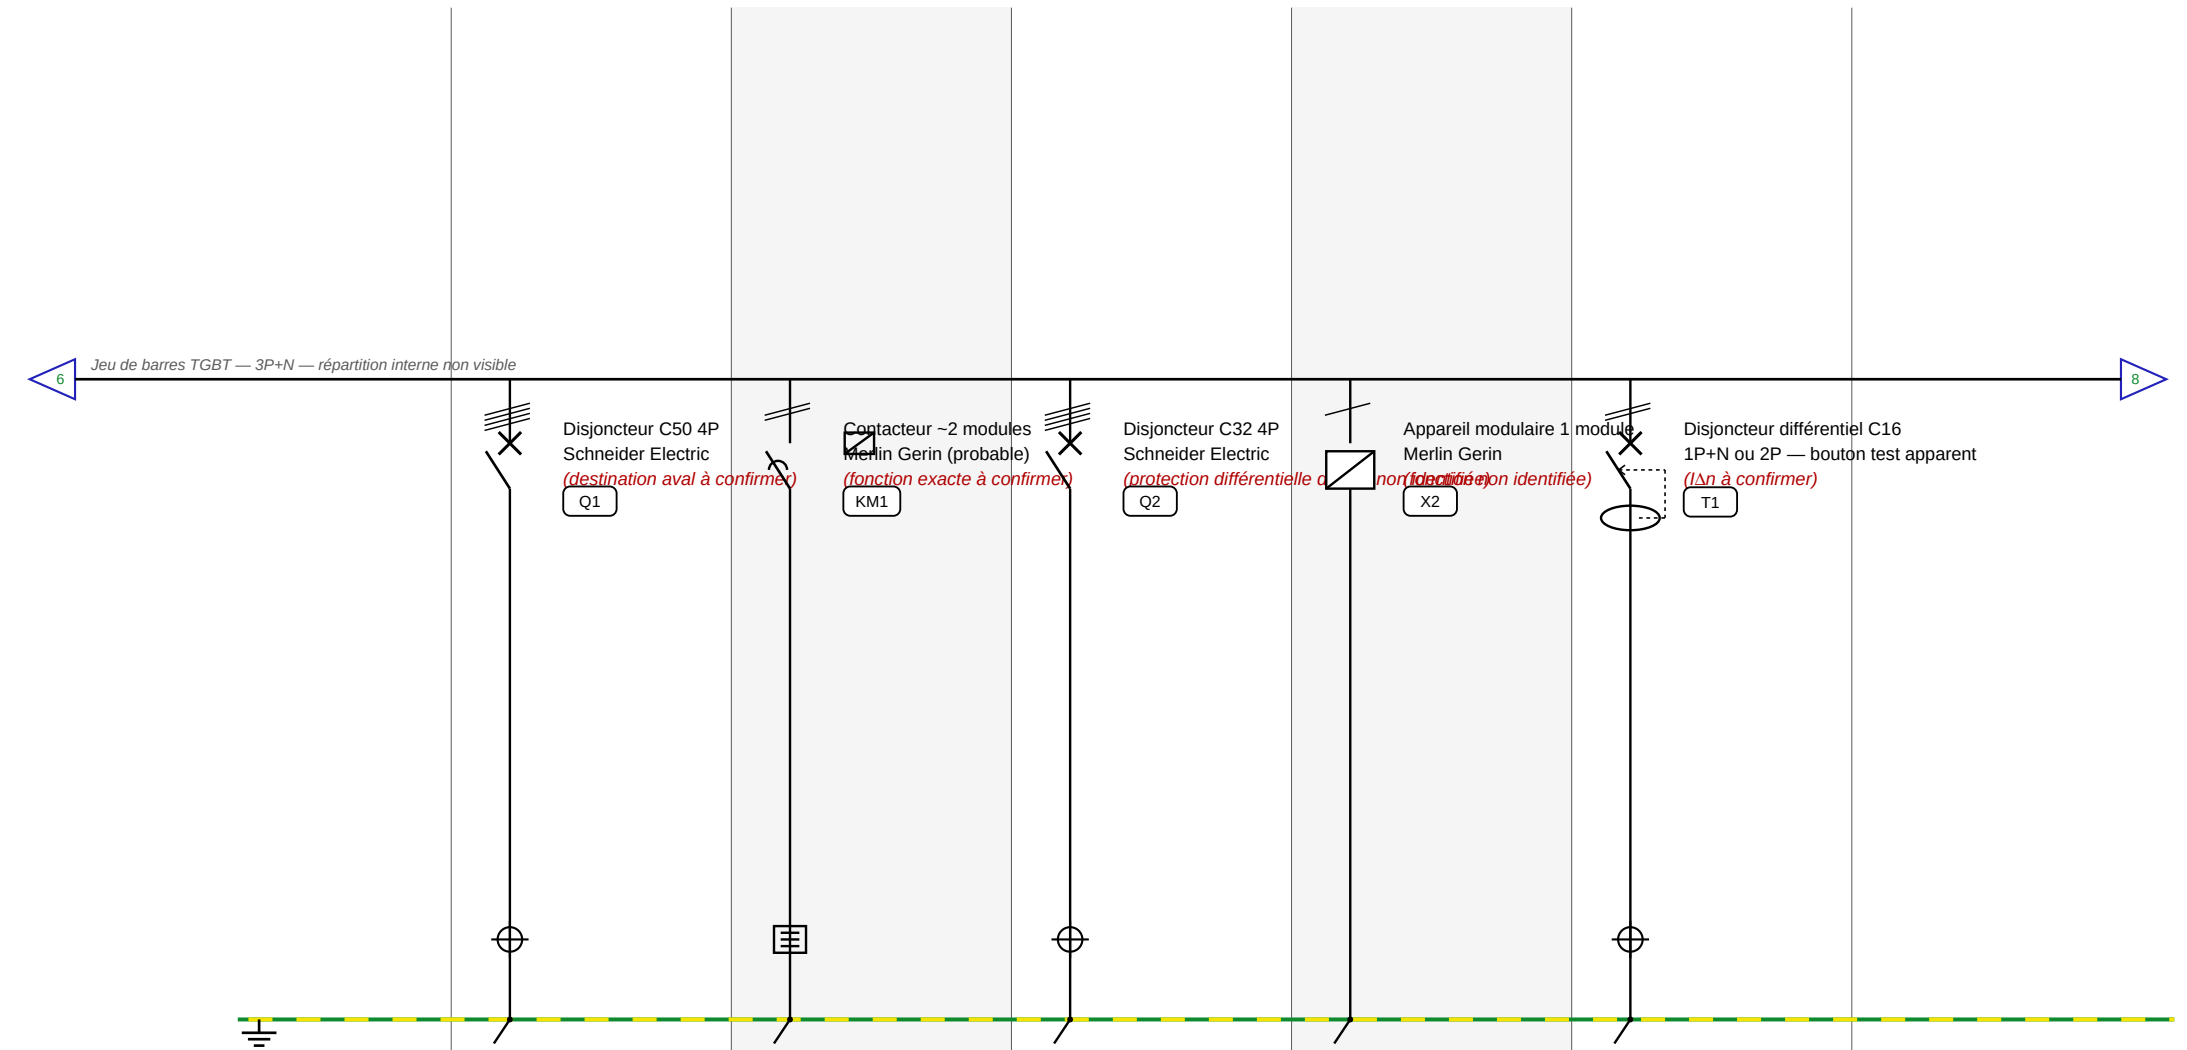

Identification du circuit	Q1	KM1	Q2	X2	T1
Désignation	Magasin / Atelier	Cumulus	Bornes IRVE	Appareil adjacent IRVE	Vestiaire / salle de formation
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	Schneider Electric	Merlin Gerin	Schneider Electric	Merlin Gerin	Schneider Electric
Fiabilité du relevé	Probable	À confirmer	Probable	À confirmer	Probable

RELEVÉ DE L'ÉTAT EXISTANT Schéma unifilaire — sans étude de conformité ni dimensionnement	Relevé tableaux électriques — état existant	Tableau Général Basse Tension	Version: 1.0	31.08.2026 (DD.MM.YYYY)	7 / 26
--	---	-------------------------------	--------------	----------------------------	--------

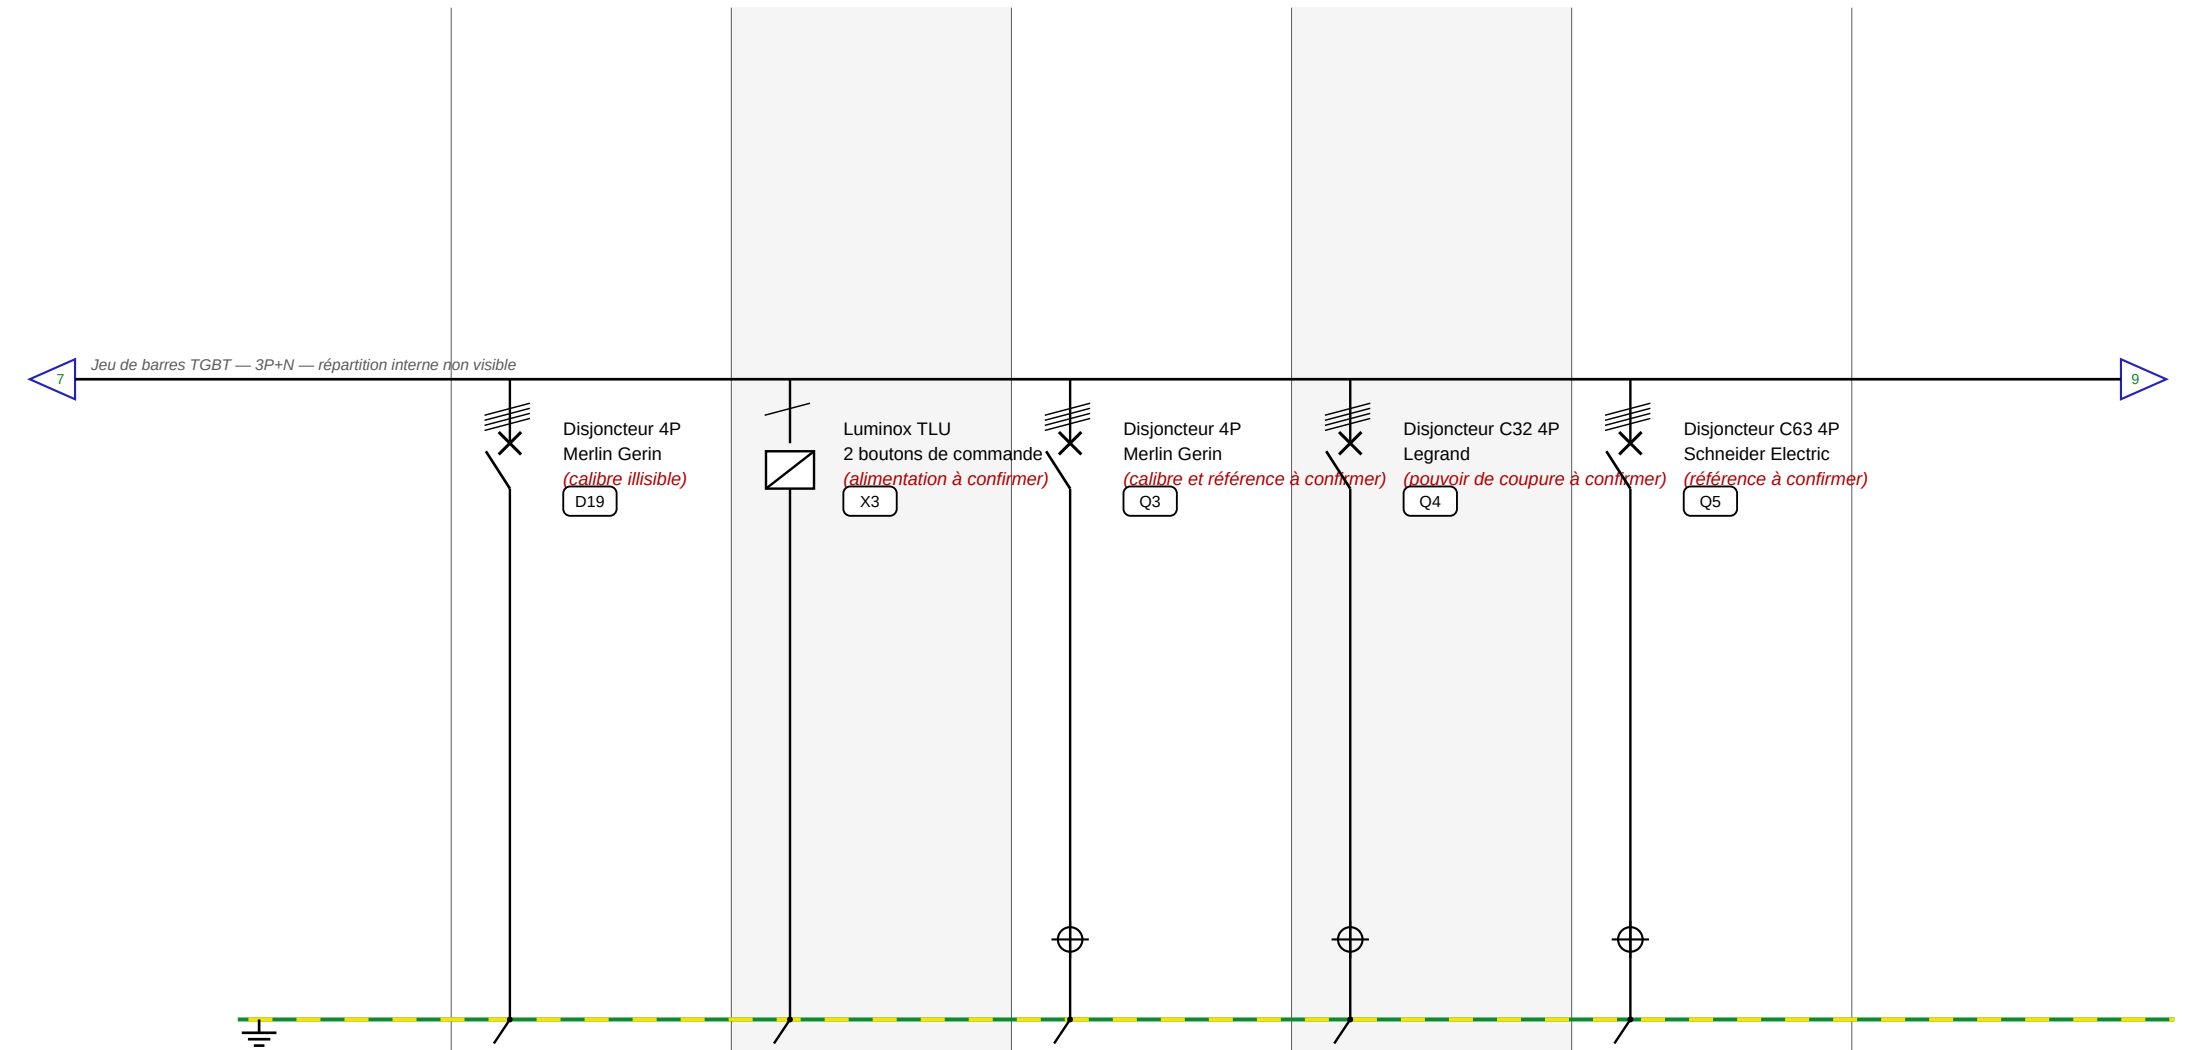

Identification du circuit	D19	X3	Q3	Q4	Q5
Désignation	Destination à confirmer	Télécommande BAES	Abri à véhicules	Salle de réunion	Général panneaux droite — salle de formation
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	Merlin Gerin	Luminox TLU	Merlin Gerin	Legrand	Schneider Electric
Fiabilité du relevé	À confirmer	À confirmer	À confirmer	Probable	Probable



Identification du circuit	DF4				
Désignation	Destination non démontrée				
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	Merlin Gerin				
Fiabilité du relevé	À confirmer				

- Légende
- Q- Dispositifs de protection
 - I- Interrupteurs
 - X- Autres appareils
 - ⊕ Tableau raccordé aux borniers
 - - - Liaison probable — à confirmer sur site
 - Rouge : donnée non confirmée par le relevé

TD ENTREPÔT

TD entrepôt — bâtiment annexe

Enveloppe : Armoire Schneider récente, 3 rangées utiles

Réseau : Triphasé + neutre


Répartiteur : Schneider Linergy Distribution Block

Coupure locale : IG 4P 63 A (Acti9 iSW-NA)

Repérage : Étiquettes détaillées


Observations

- D0 (auxiliaires) est raccordé en amont de l'interrupteur général : il reste sous tension après ouverture de l'IG.
- Accessoire MX + contact auxiliaire OF associés à l'IG ; référence illisible.

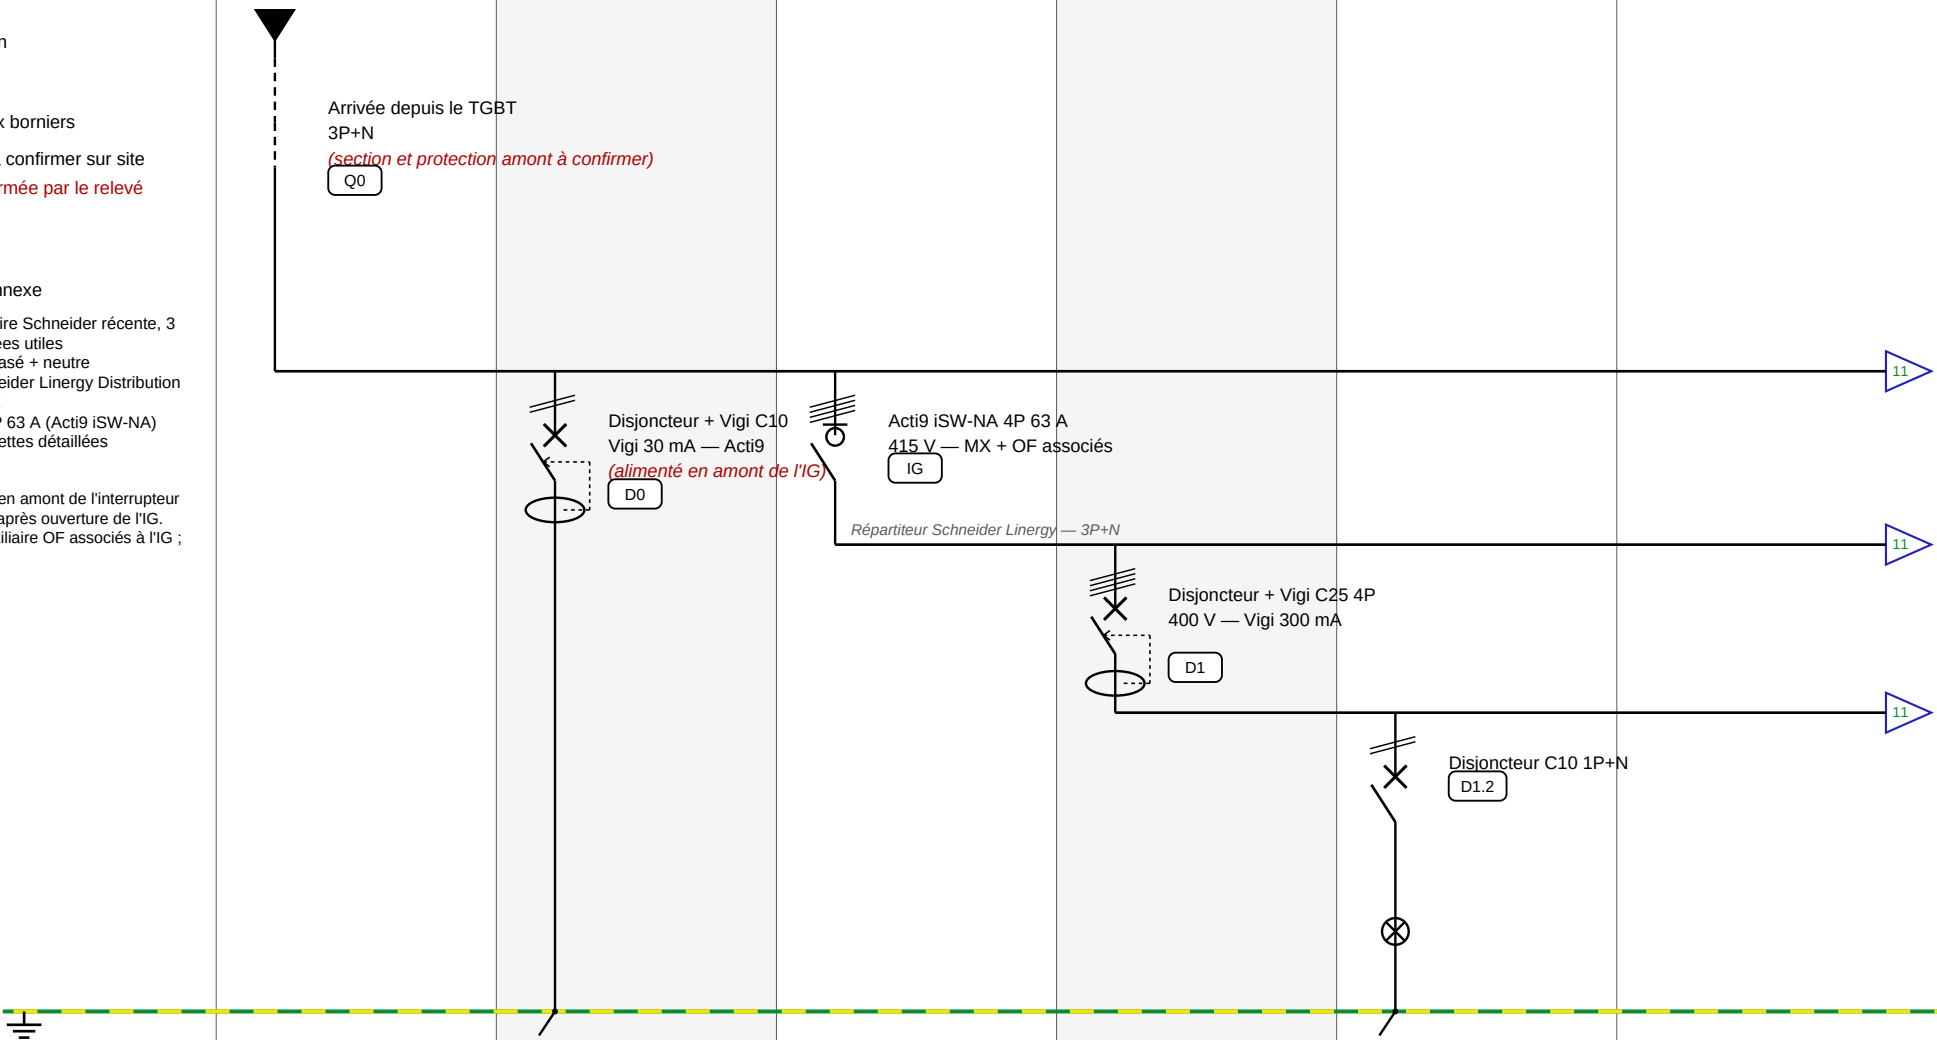


Identification du circuit	Q0	D0	IG	D1	D1.2
Désignation	Arrivée entrepôt	Auxiliaires — amont général	Interrupteur général tableau	Général éclairage	Éclairage atelier zone 1
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	—	Schneider Acti9	Acti9 iSW-NA	Schneider Acti9	Schneider Acti9
Fiabilité du relevé	À confirmer	Confirmé	Confirmé	Confirmé	Probable

RELEVÉ DE L'ÉTAT EXISTANT Schéma unifilaire — sans étude de conformité ni dimensionnement	Relevé tableaux électriques — état existant	TD entrepôt — bâtiment annexe	Version: 1.0	31.08.2026 (DD.MM.YYYY)	10 / 26
---	---	-------------------------------	--------------	----------------------------	---------

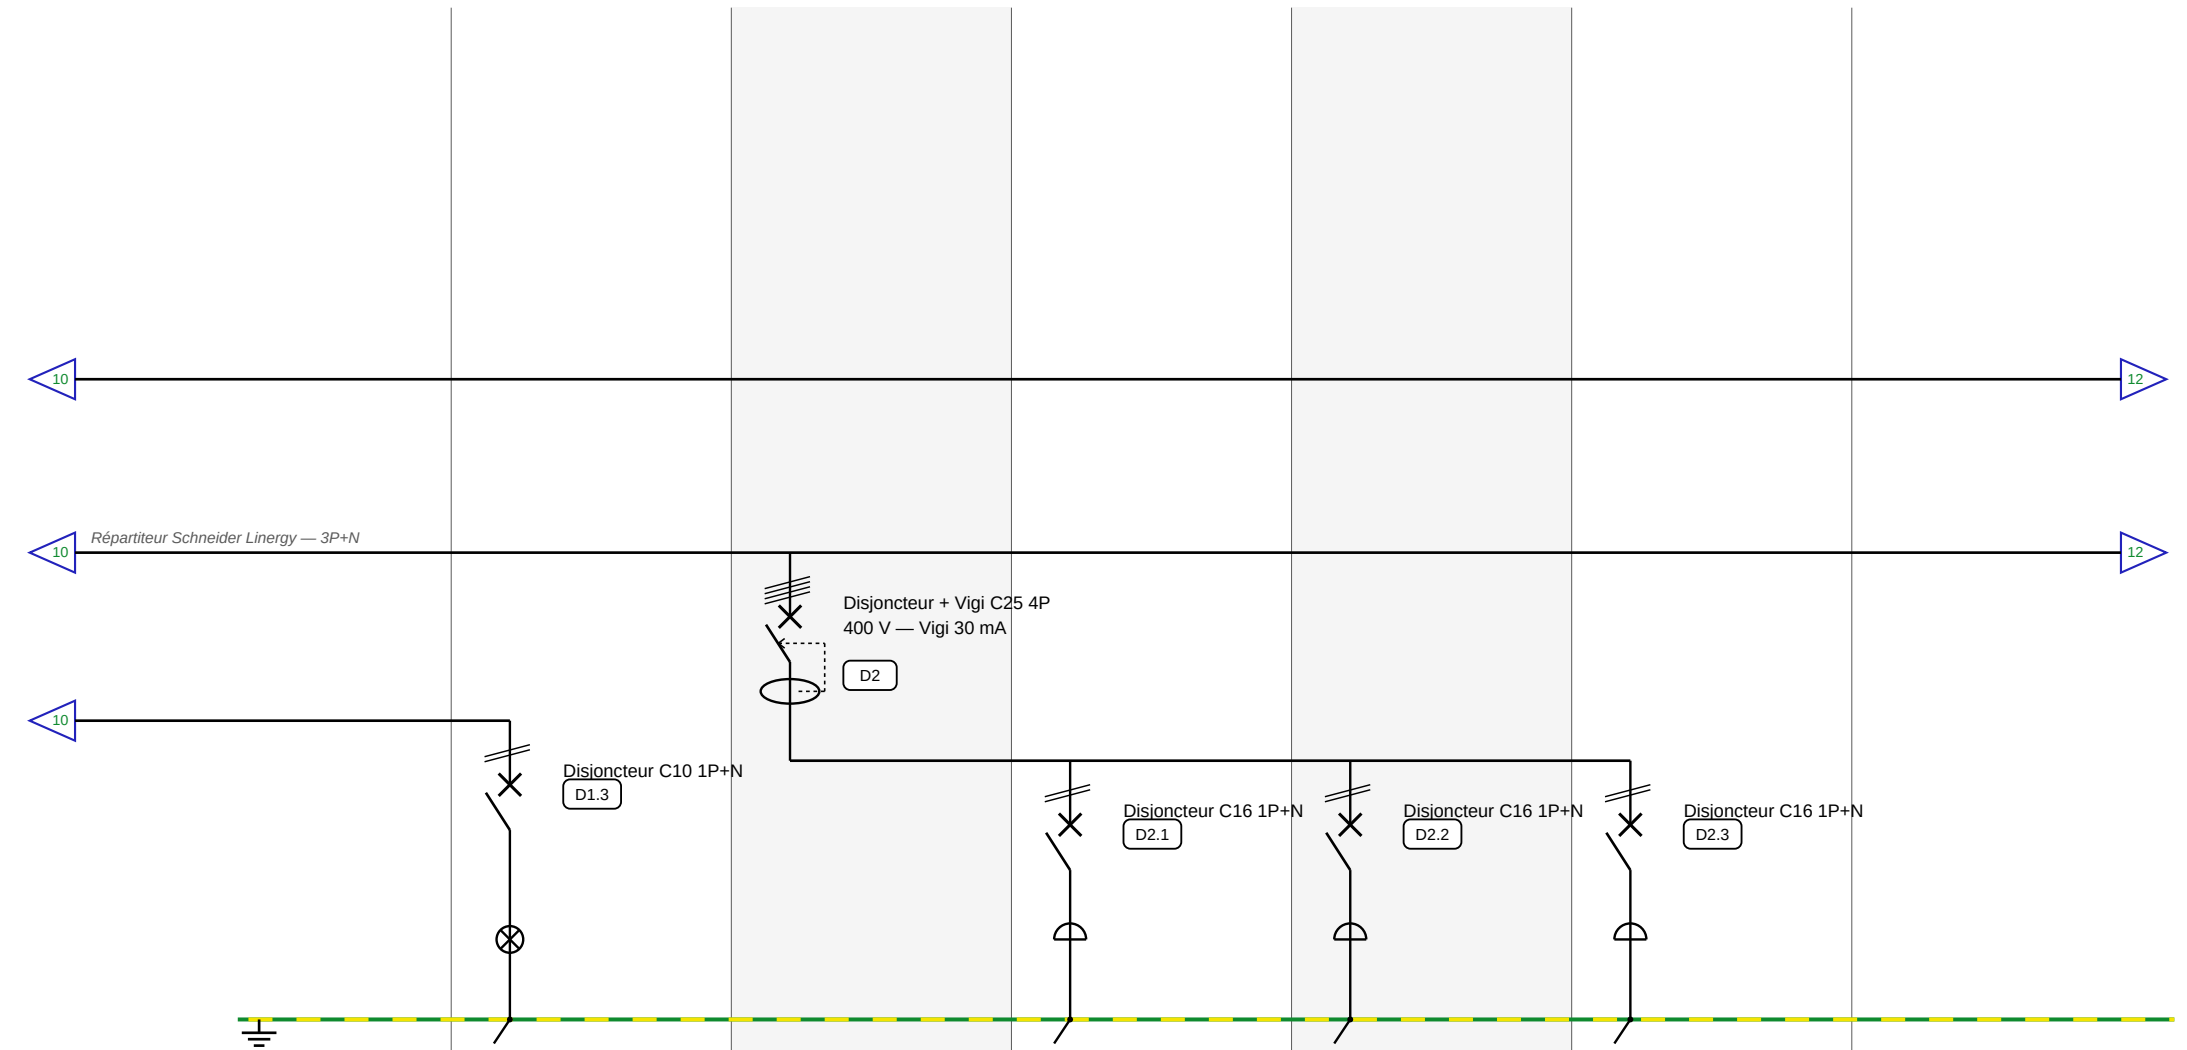


Identification du circuit	D1.3	D2	D2.1	D2.2	D2.3
Désignation	Éclairage atelier / BAES zone 2	Général prises de courant entrepôt	Prises de courant entrepôt	Prises de courant entrepôt	Prises de courant entrepôt
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	Schneider Acti9	Schneider Acti9	Schneider Acti9	Schneider Acti9	Schneider Acti9
Fiabilité du relevé	Probable	Confirmé	Probable	Probable	Probable

RELEVÉ DE L'ÉTAT EXISTANT Schéma unifilaire — sans étude de conformité ni dimensionnement	Relevé tableaux électriques — état existant	TD entrepôt — bâtiment annexe	Version: 1.0	31.08.2026 (DD.MM.YYYY)	11 / 26
--	---	-------------------------------	--------------	----------------------------	---------

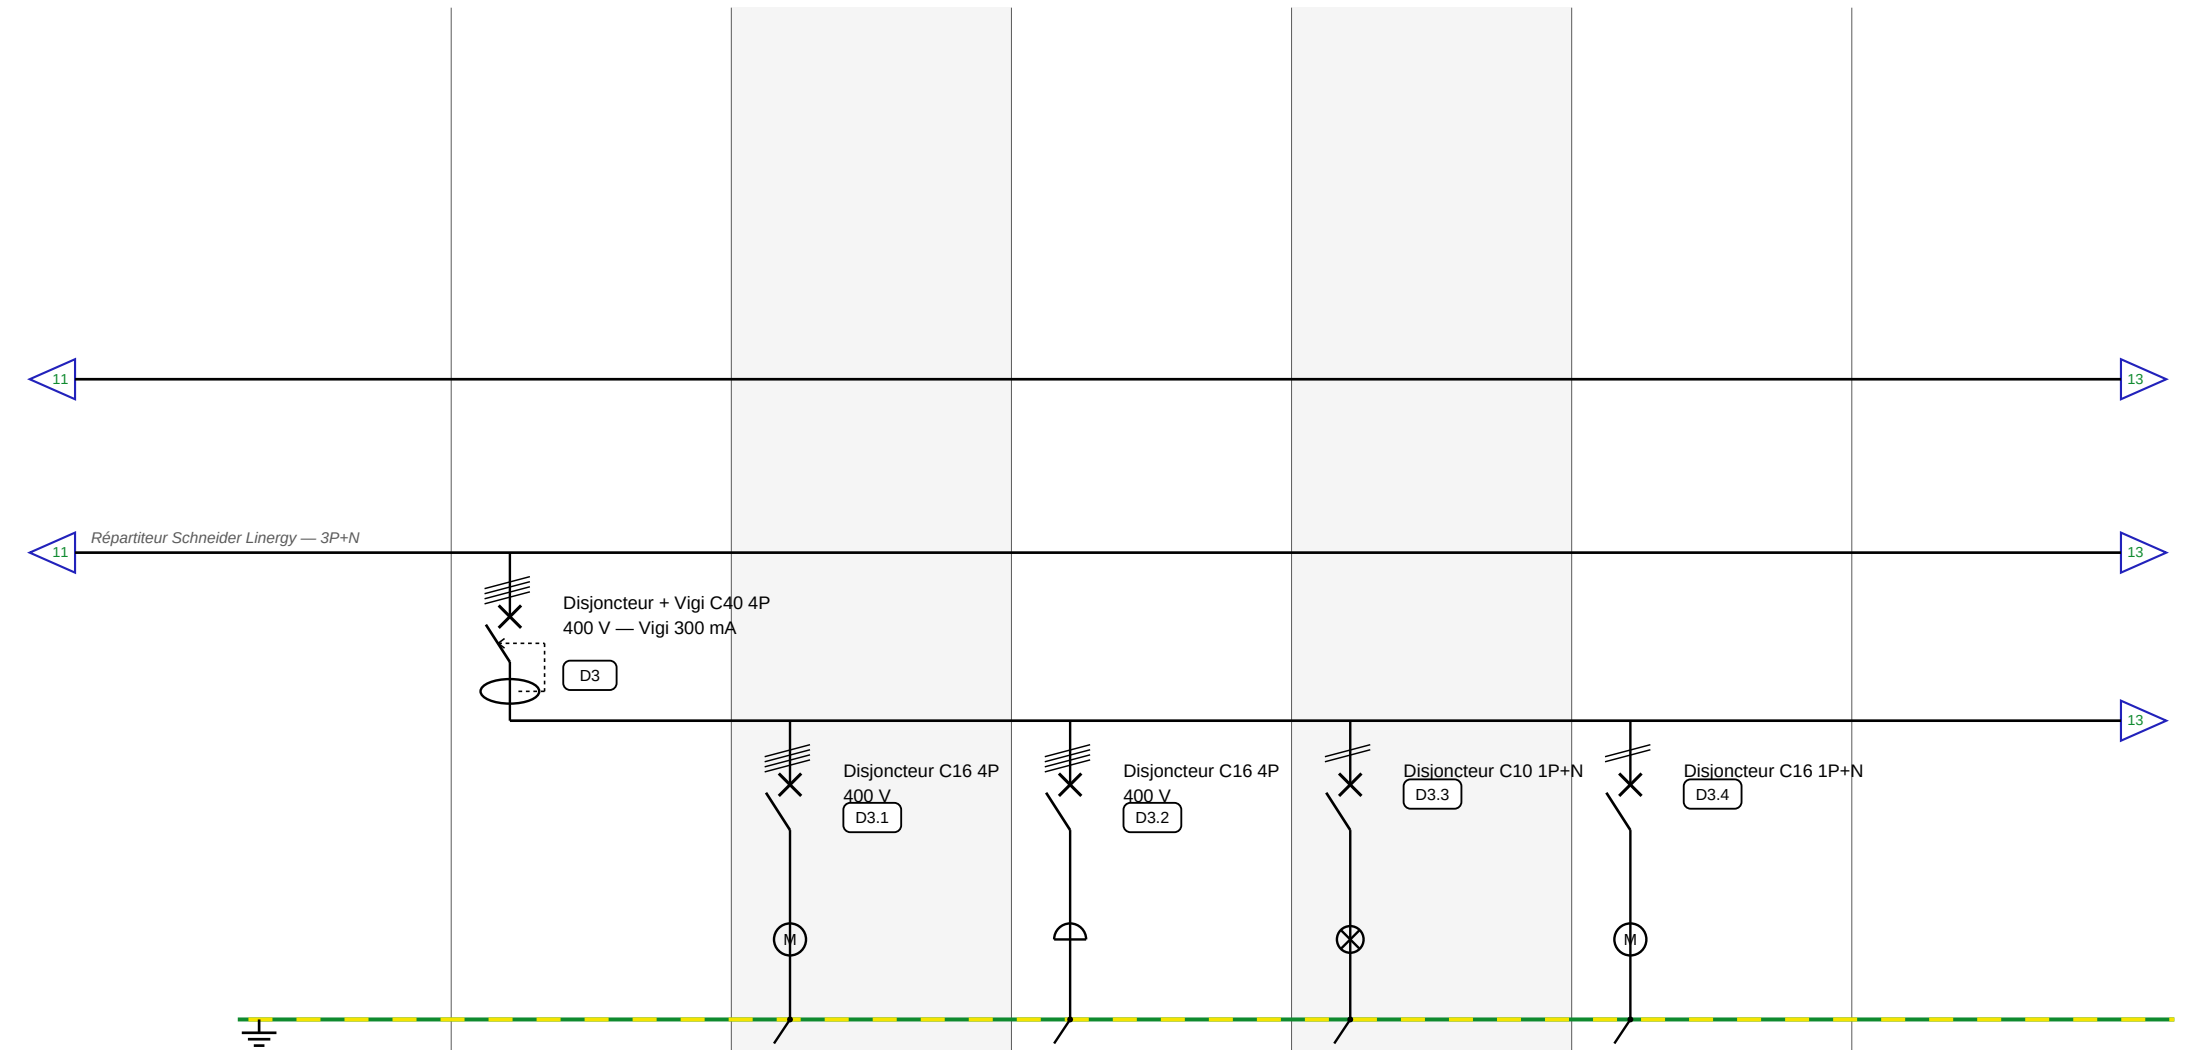

Identification du circuit	D3	D3.1	D3.2	D3.3	D3.4
Désignation	Général divers	Porte sectionnelle	Alimentation Fenwick	Éclairage extérieur	Alimentation portail
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	Schneider Acti9	Schneider Acti9	Schneider Acti9	Schneider Acti9	Schneider Acti9
Fiabilité du relevé	Confirmé	Confirmé	Confirmé	Probable	Probable

RELEVÉ DE L'ÉTAT EXISTANT Schéma unifilaire — sans étude de conformité ni dimensionnement	Relevé tableaux électriques — état existant	TD entrepôt — bâtiment annexe	Version: 1.0	31.08.2026 (DD.MM.YYYY)	12 / 26
--	---	-------------------------------	--------------	----------------------------	---------

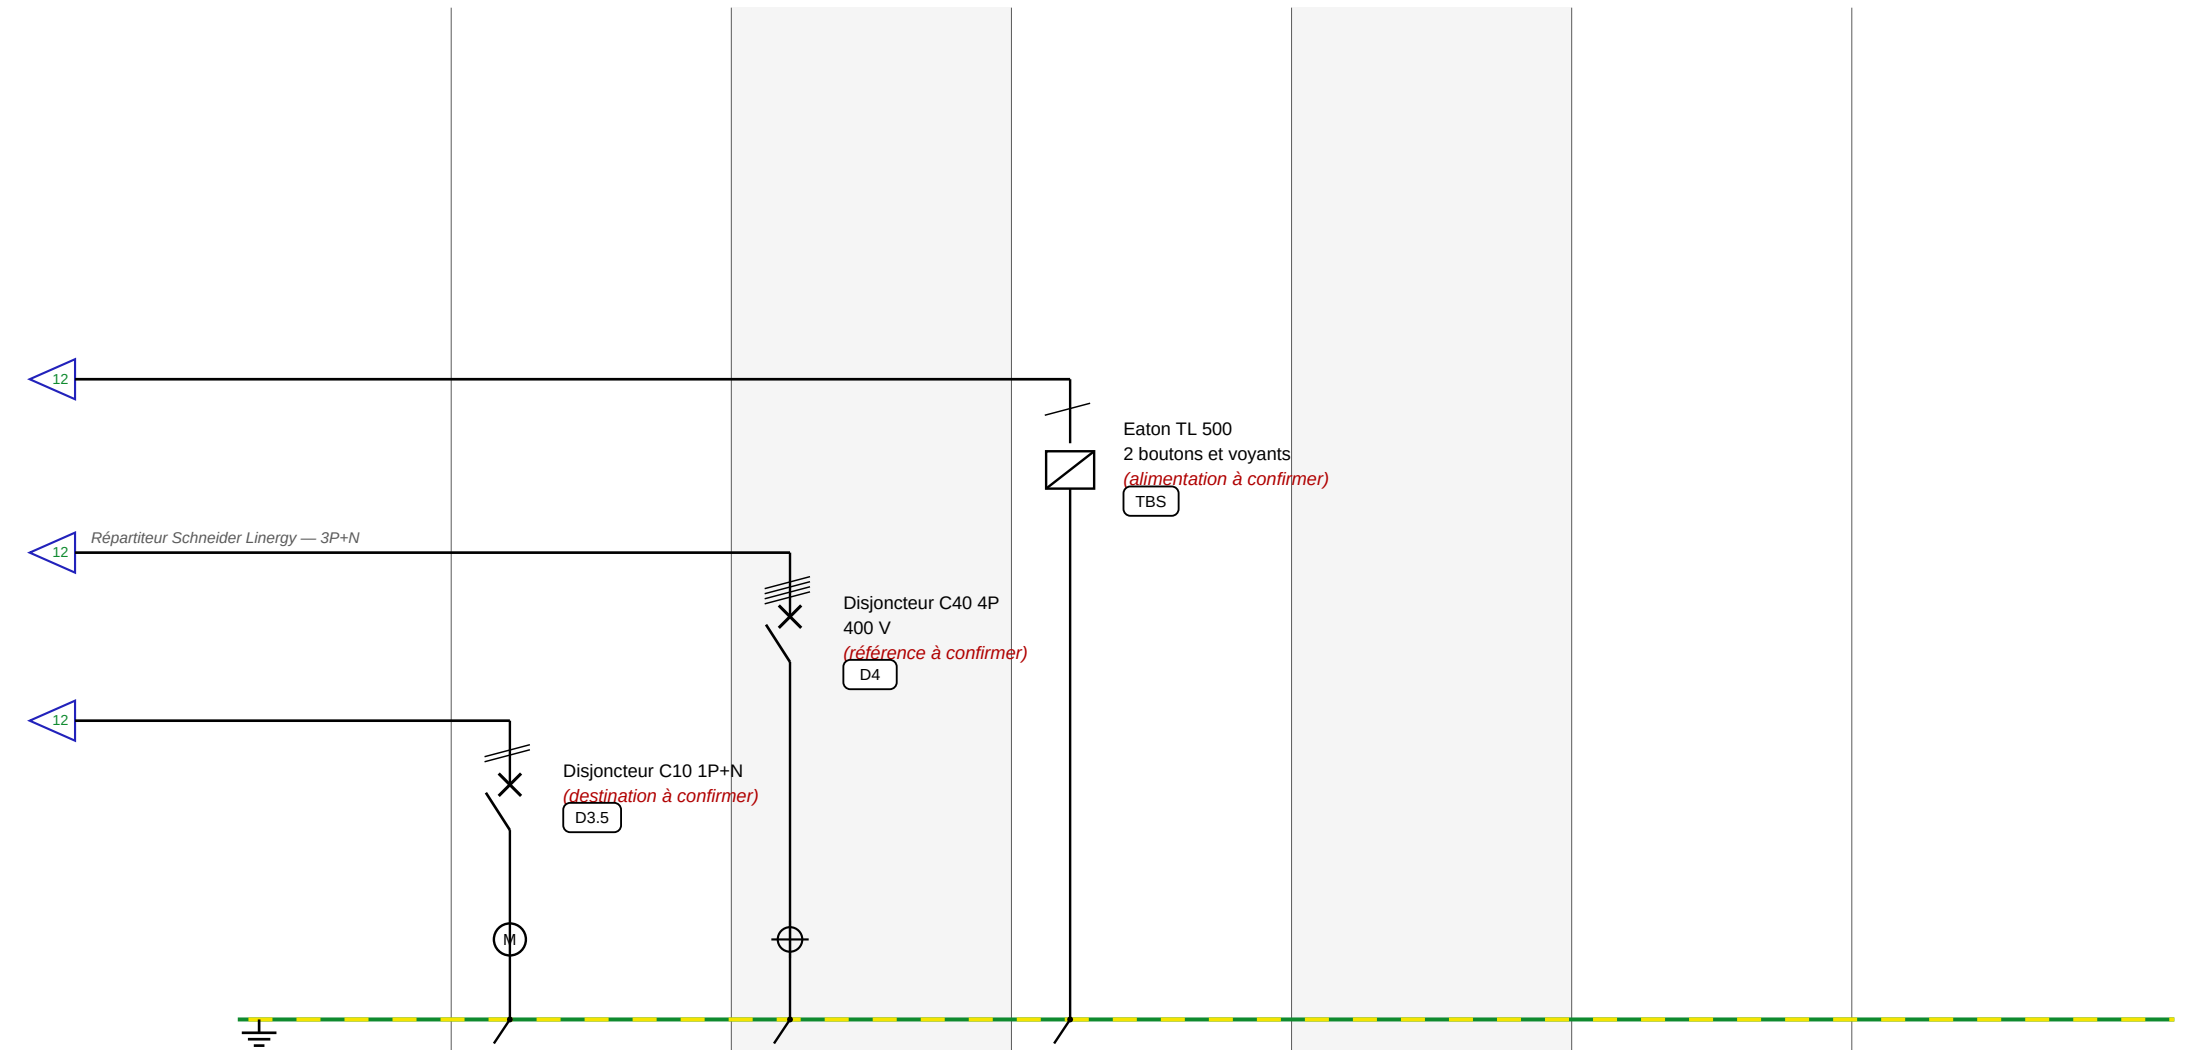

Identification du circuit	D3.5	D4	TBS		
Désignation	Porte Sud (mention manuscrite)	Coffret prises atelier	Télécommande BAES		
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	Schneider Acti9	Schneider Acti9	Eaton TL 500		
Fiabilité du relevé	À confirmer	Probable	À confirmer		

- Légende
- Q- Dispositifs de protection
 - I- Interrupteurs
 - X- Autres appareils
 - ⊕ Tableau raccordé aux borniers
 - - - Liaison probable — à confirmer sur site
- Rouge : donnée non confirmée par le relevé

TDS PRISES

TDS prises entrepôt — bâtiment annexe

Enveloppe : Coffret étanche à porte transparente, 1 rangée


Appareillage : Schneider Electric Acti9

Départs : 3 circuits de prises

Répartition : Répartition L1/L2/L3 possible, non visible

Observations

- Protection amont du coffret non visible : arrivée tracée en pointillé.

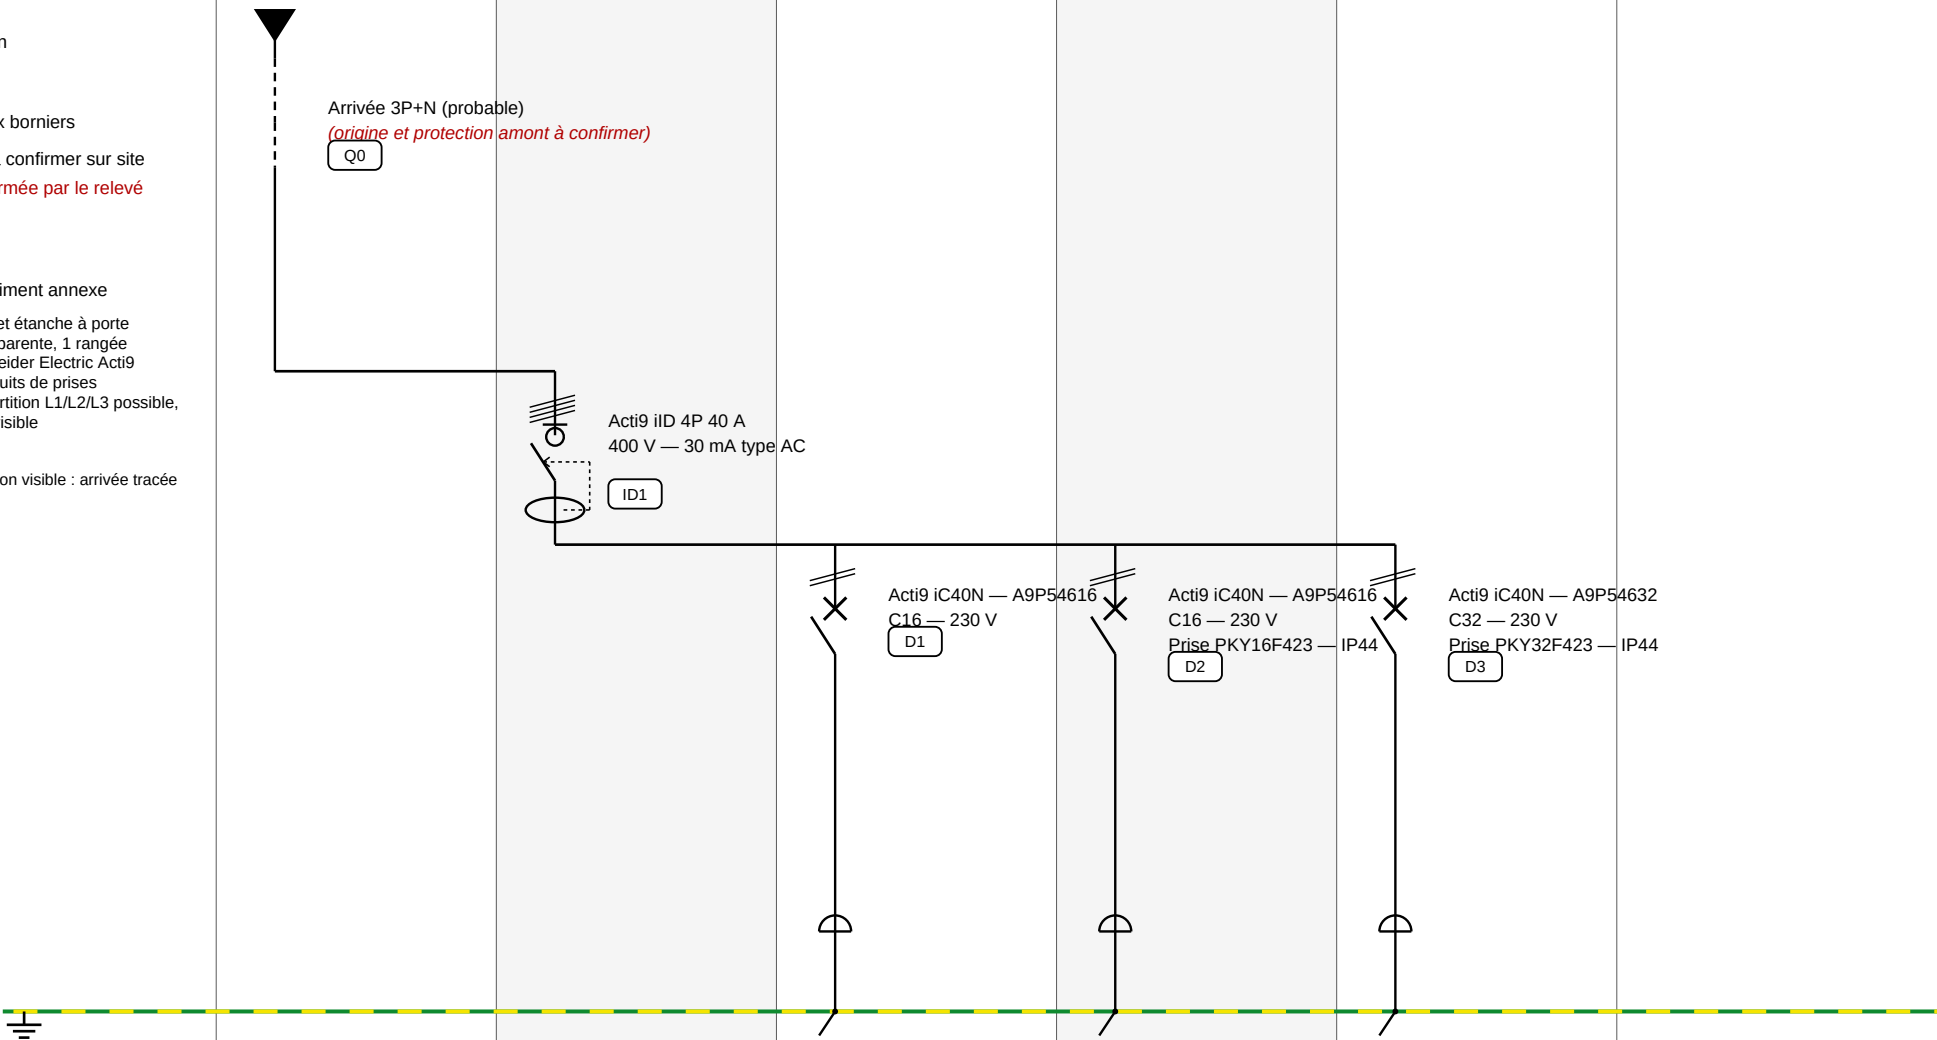

Identification du circuit	Q0	ID1	D1	D2	D3
Désignation	Arrivée TDS prises	Général prises	PC1 — prise sous capot IP65	PC2 — prise industrielle 16 A	PC3 — prise industrielle 32 A
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	—	Acti9 iID	Acti9 iC40N	Acti9 iC40N	Acti9 iC40N
Fiabilité du relevé	À confirmer	Confirmé	Confirmé	Confirmé	Confirmé

RELEVÉ DE L'ÉTAT EXISTANT	Relevé tableaux électriques — état existant	TDS prises entrepôt — bâtiment annexe	Version: 1.0	31.08.2026 (DD.MM.YYYY)	14 / 26
Schéma unifilaire — sans étude de conformité ni dimensionnement					

Légende

Q- Dispositifs de protection

I- Interrupteurs

X- Autres appareils

⊕ Tableau raccordé aux borniers

- - - Liaison probable — à confirmer sur site

Rouge : donnée non confirmée par le relevé

TD RIDEAUX

TD rideaux hangar — bâtiment annexe

Enveloppe : Coffret étanche gris, porte transparente, 2 rangées


Alimentation : Triphasée (probable)

Coupure générale : Non visible dans le coffret

Répartiteur : Legrand 048 88 — 125 A / 400 V

Observations

- Le répartiteur Legrand alimente probablement les trois départs D10 + Vigi 300 mA.
- Protection amont du coffret non visible.

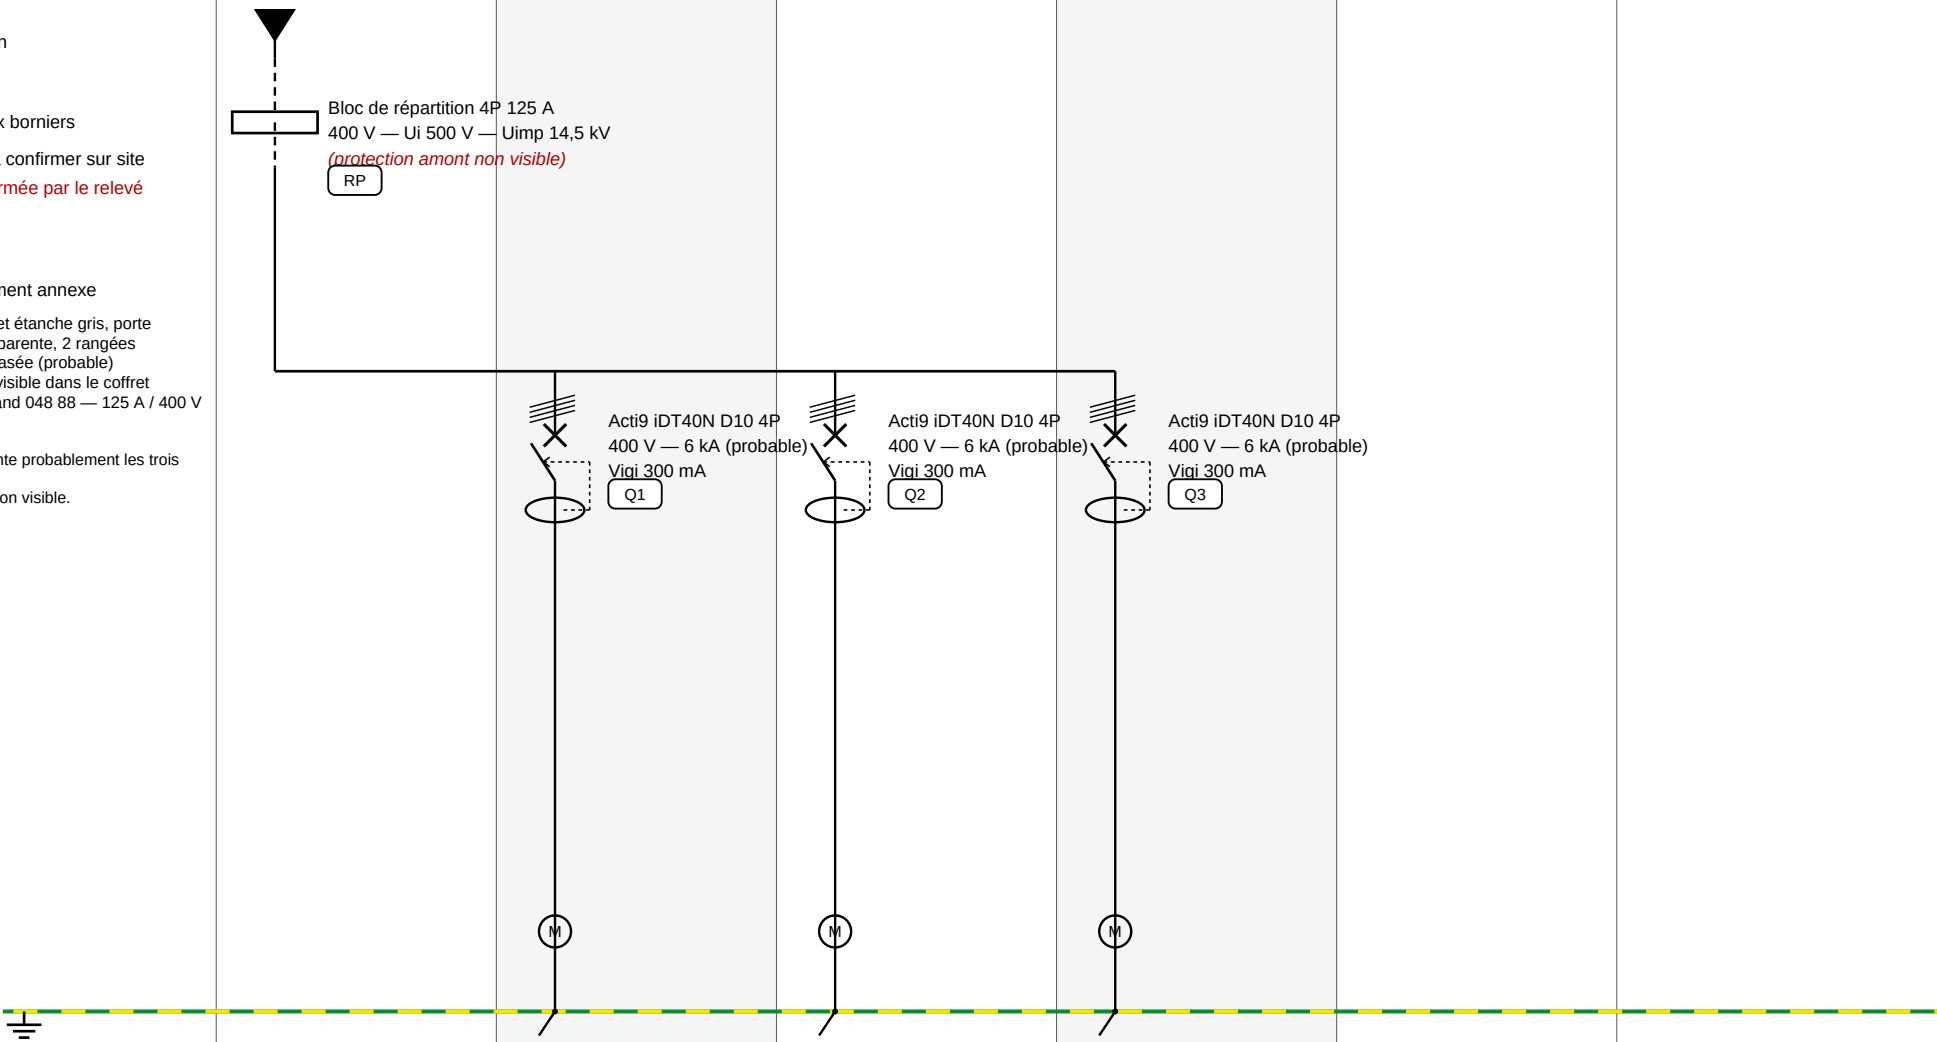

Identification du circuit	RP	Q1	Q2	Q3	
Désignation	Répartiteur Legrand 048 88	Rideaux 1 et 2	Rideaux 3 et 4	Rideaux 5 et 6	
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	Legrand 048 88	Acti9 iDT40N	Acti9 iDT40N	Acti9 iDT40N	
Fiabilité du relevé	Probable	Probable	Probable	Probable	

RELEVÉ DE L'ÉTAT EXISTANT Schéma unifilaire — sans étude de conformité ni dimensionnement	Relevé tableaux électriques — état existant	TD rideaux hangar — bâtiment annexe	Version: 1.0	31.08.2026 (DD.MM.YYYY)	15 / 26
---	---	-------------------------------------	--------------	----------------------------	---------

- Légende
- Q- Dispositifs de protection
 - I- Interrupteurs
 - X- Autres appareils
 - ⊕ Tableau raccordé aux borniers
 - - - Liaison probable — à confirmer sur site
- Rouge : donnée non confirmée par le relevé

TD HANGAR

TD hangar — bâtiment annexe

Enveloppe : Grande armoire métallique ancienne

Rangées : 3 rangées actives

Fabricants : Schneider, Merlin Gerin, Finder, non identifiés

Réseau : Triphasé + neutre (probable)


Appareil général : Aucun appareil unique identifié

Parafoudre : Aucun identifiable

Observations

- Aucun organe de coupure générale n'est identifié : l'arrivée est tracée en pointillé.
- L'affectation des circuits terminaux aux quatre généraux n'est pas démontrée par le relevé.

Alerte de schéma — le rattachement des circuits terminaux aux appareils généraux (éclairage, prises, rideau) est déduit du repérage visible et non du câblage : toutes ces liaisons sont tracées en pointillé et restent à confirmer.

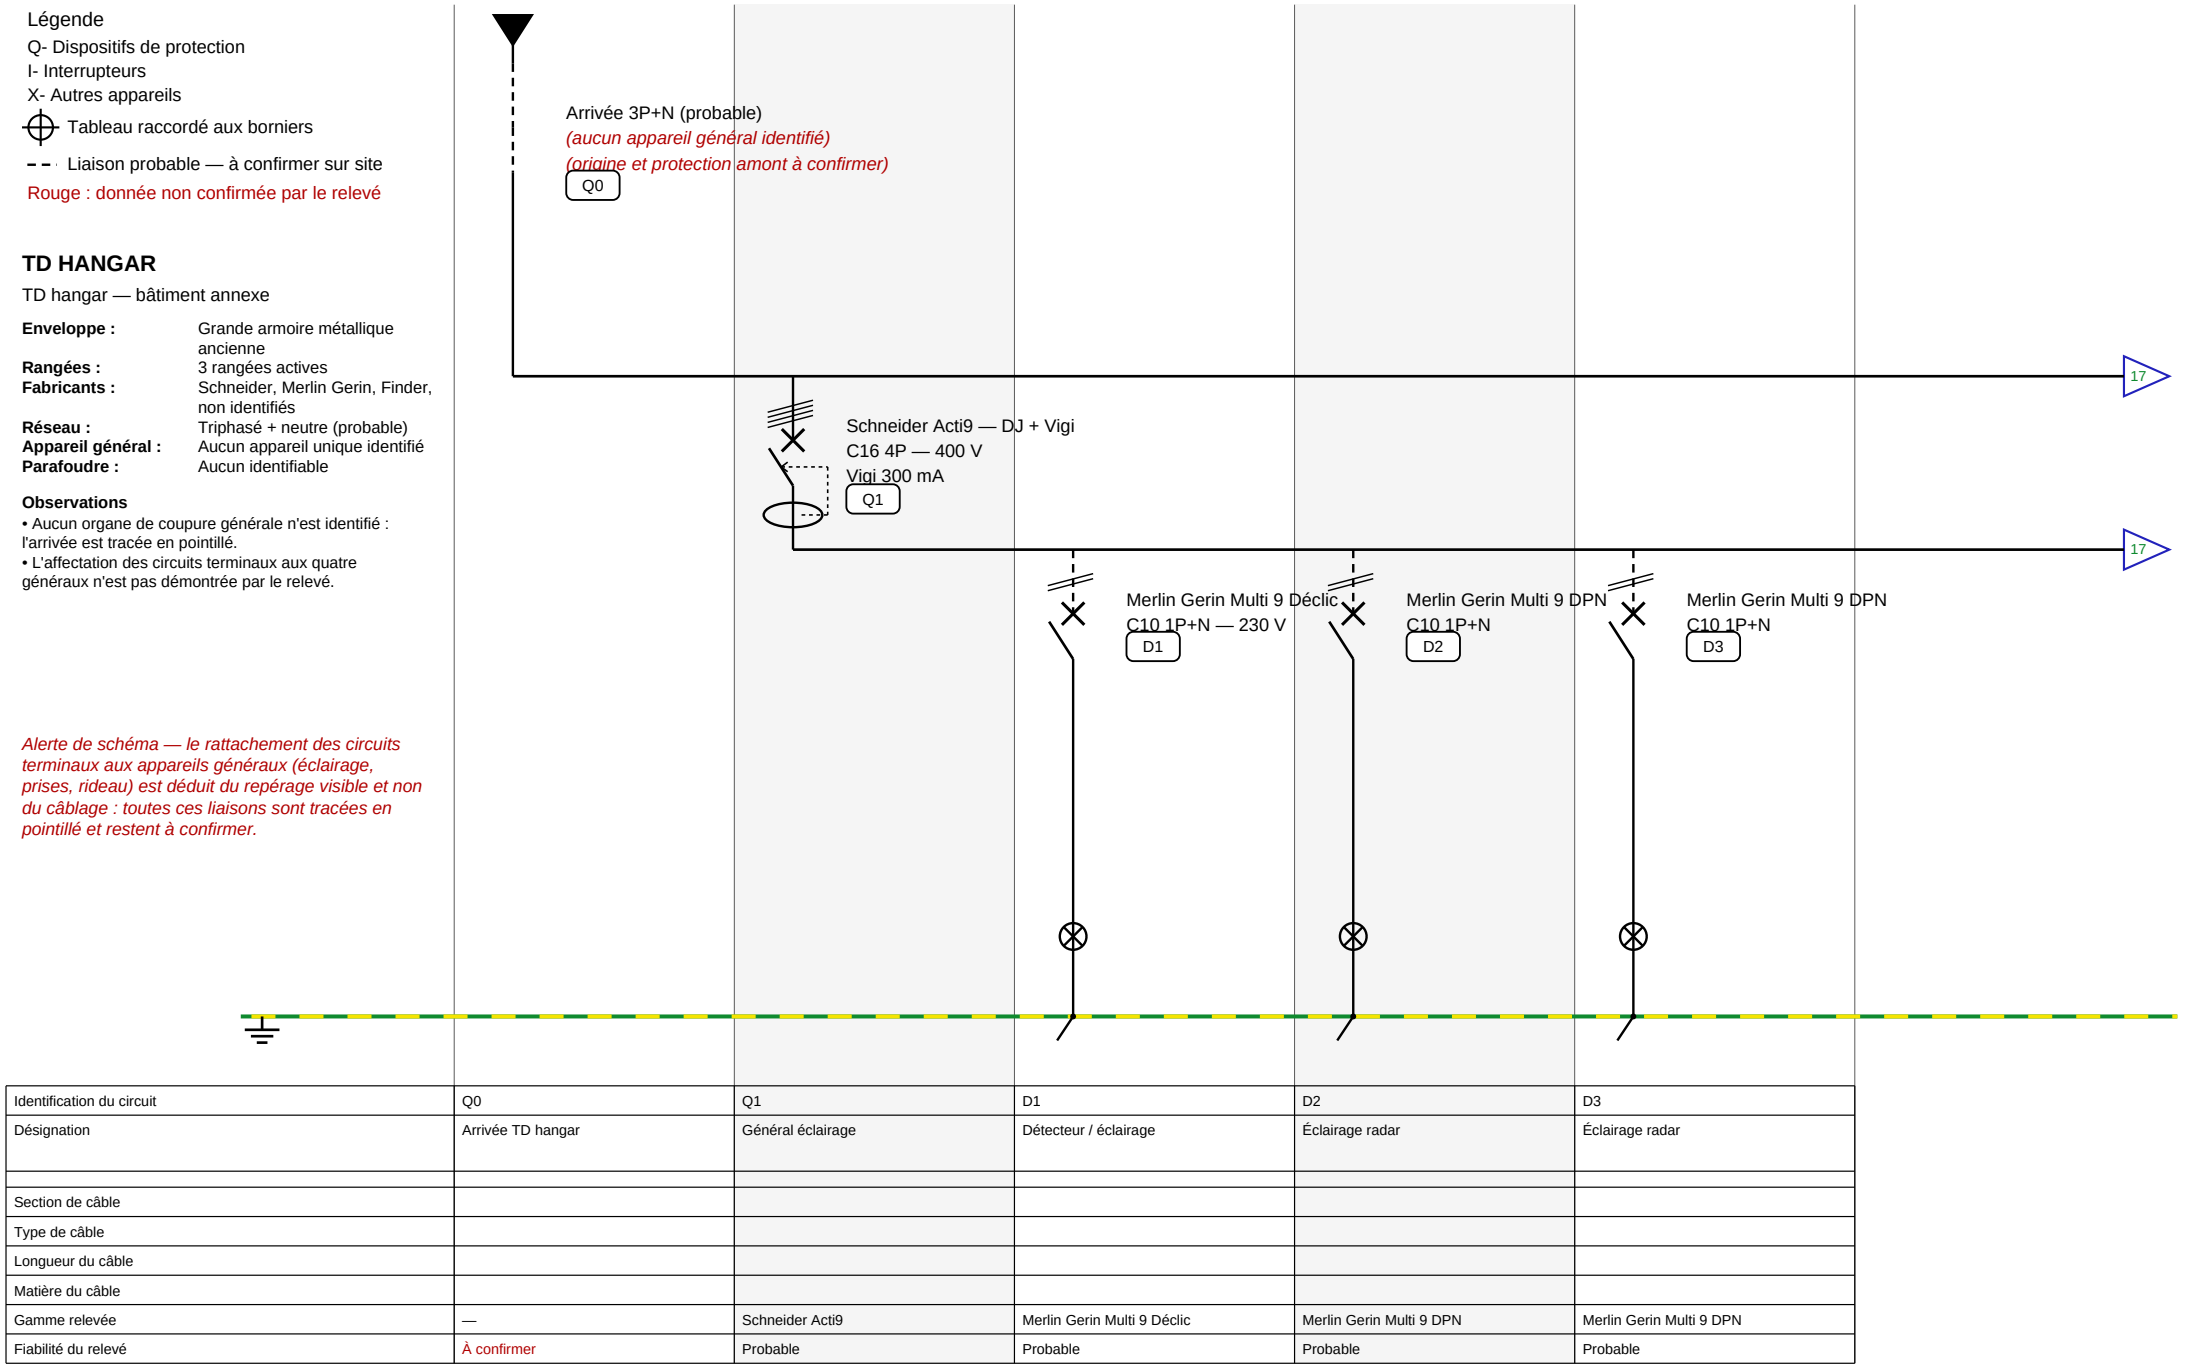

RELEVÉ DE L'ÉTAT EXISTANT

Schéma unifilaire — sans étude de conformité ni dimensionnement


Relevé tableaux électriques — état existant

TD hangar — bâtiment annexe

Version: 1.0


31.08.2026
(DD.MM.YYYY)

16 / 26

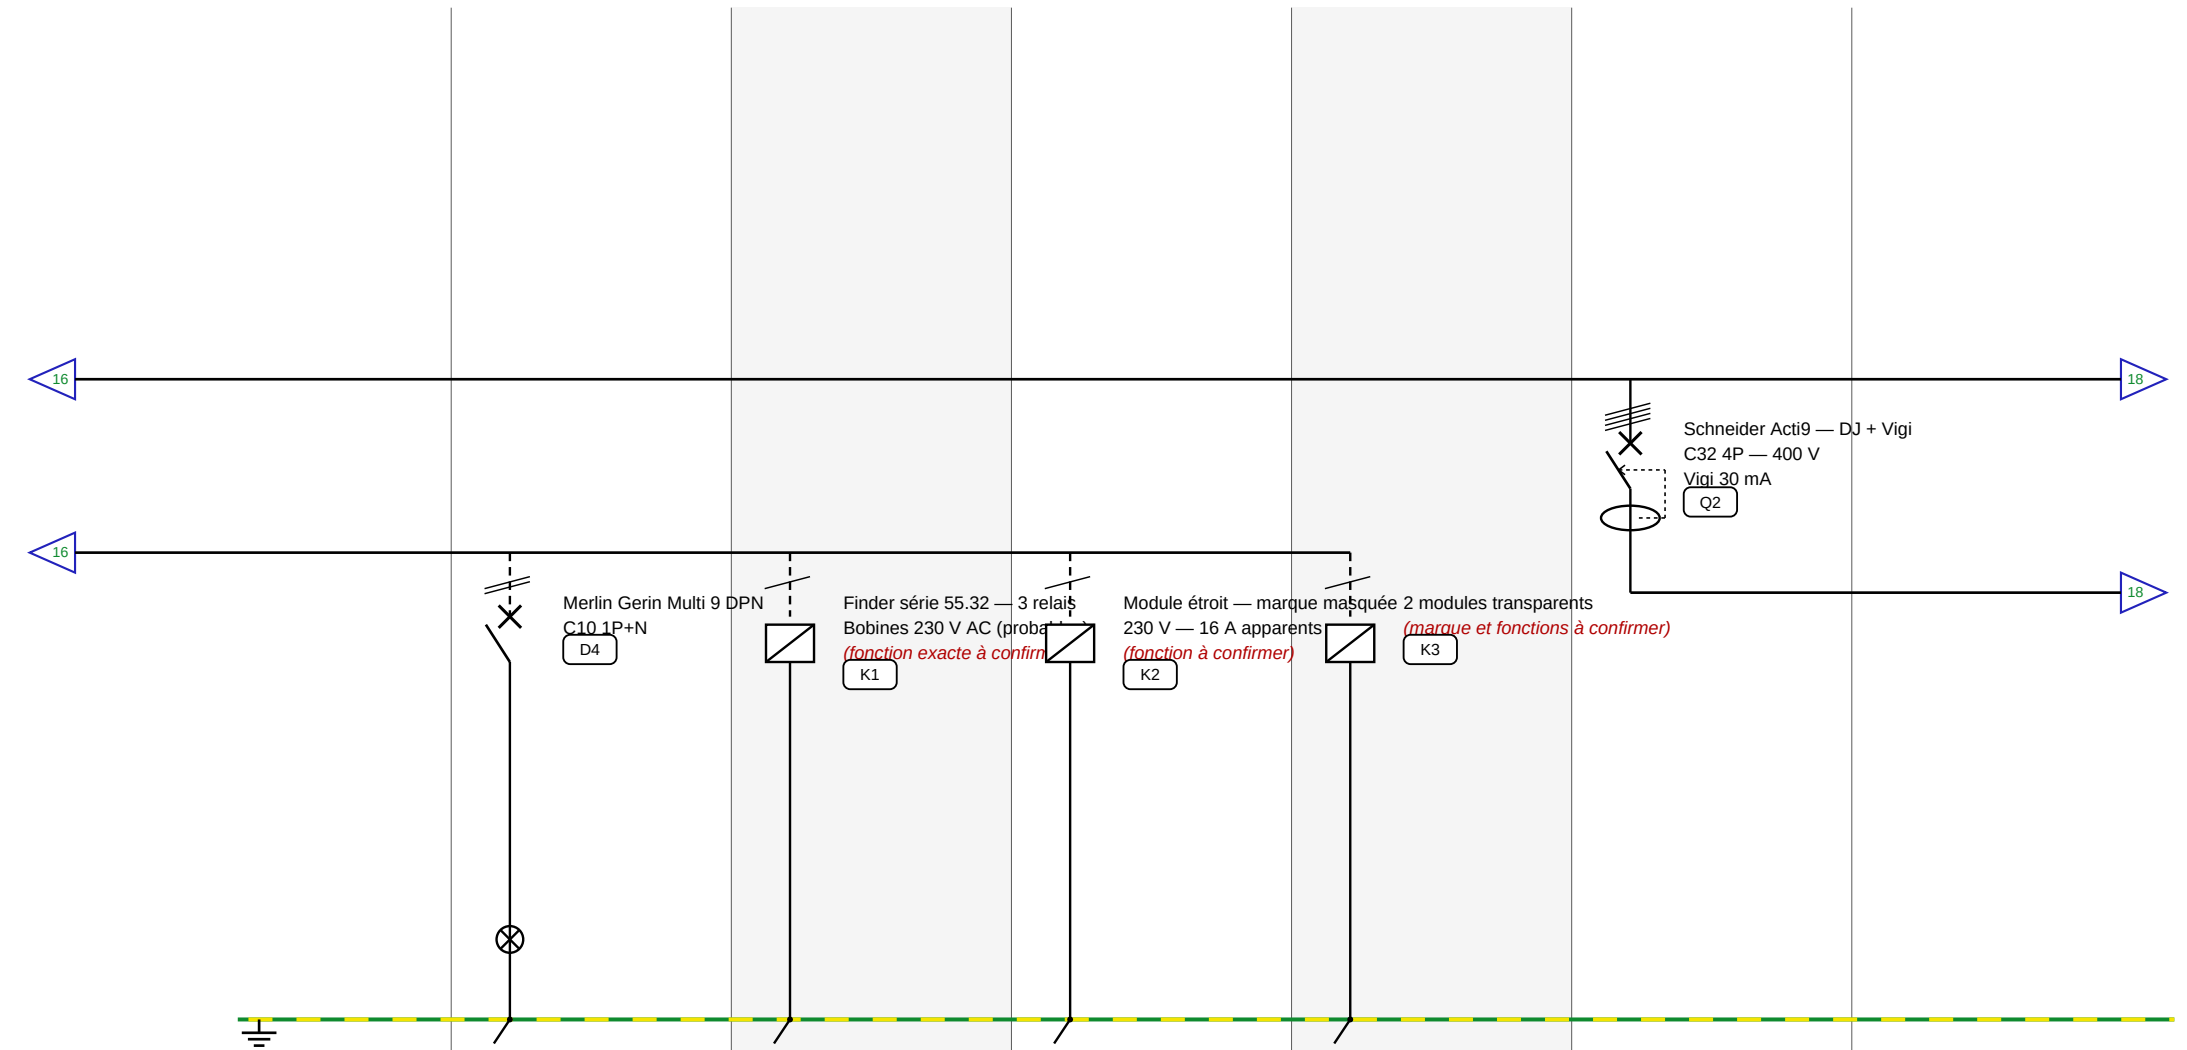


Identification du circuit	D4	K1	K2	K3	Q2
Désignation	Éclairage radar	Relais H.G / H.D / H.?	Relais / térupteur	Minuterics / temporisateurs	Général prises
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	Merlin Gerin Multi 9 DPN	Finder 55.32	Non identifié	Non identifié	Schneider Acti9
Fiabilité du relevé	Probable	À confirmer	À confirmer	À confirmer	Probable


RELEVÉ DE L'ÉTAT EXISTANT Schéma unifilaire — sans étude de conformité ni dimensionnement	Relevé tableaux électriques — état existant	TD hangar — bâtiment annexe	Version: 1.0	31.08.2026 (DD.MM.YYYY)	17 / 26
--	---	-----------------------------	--------------	----------------------------	---------

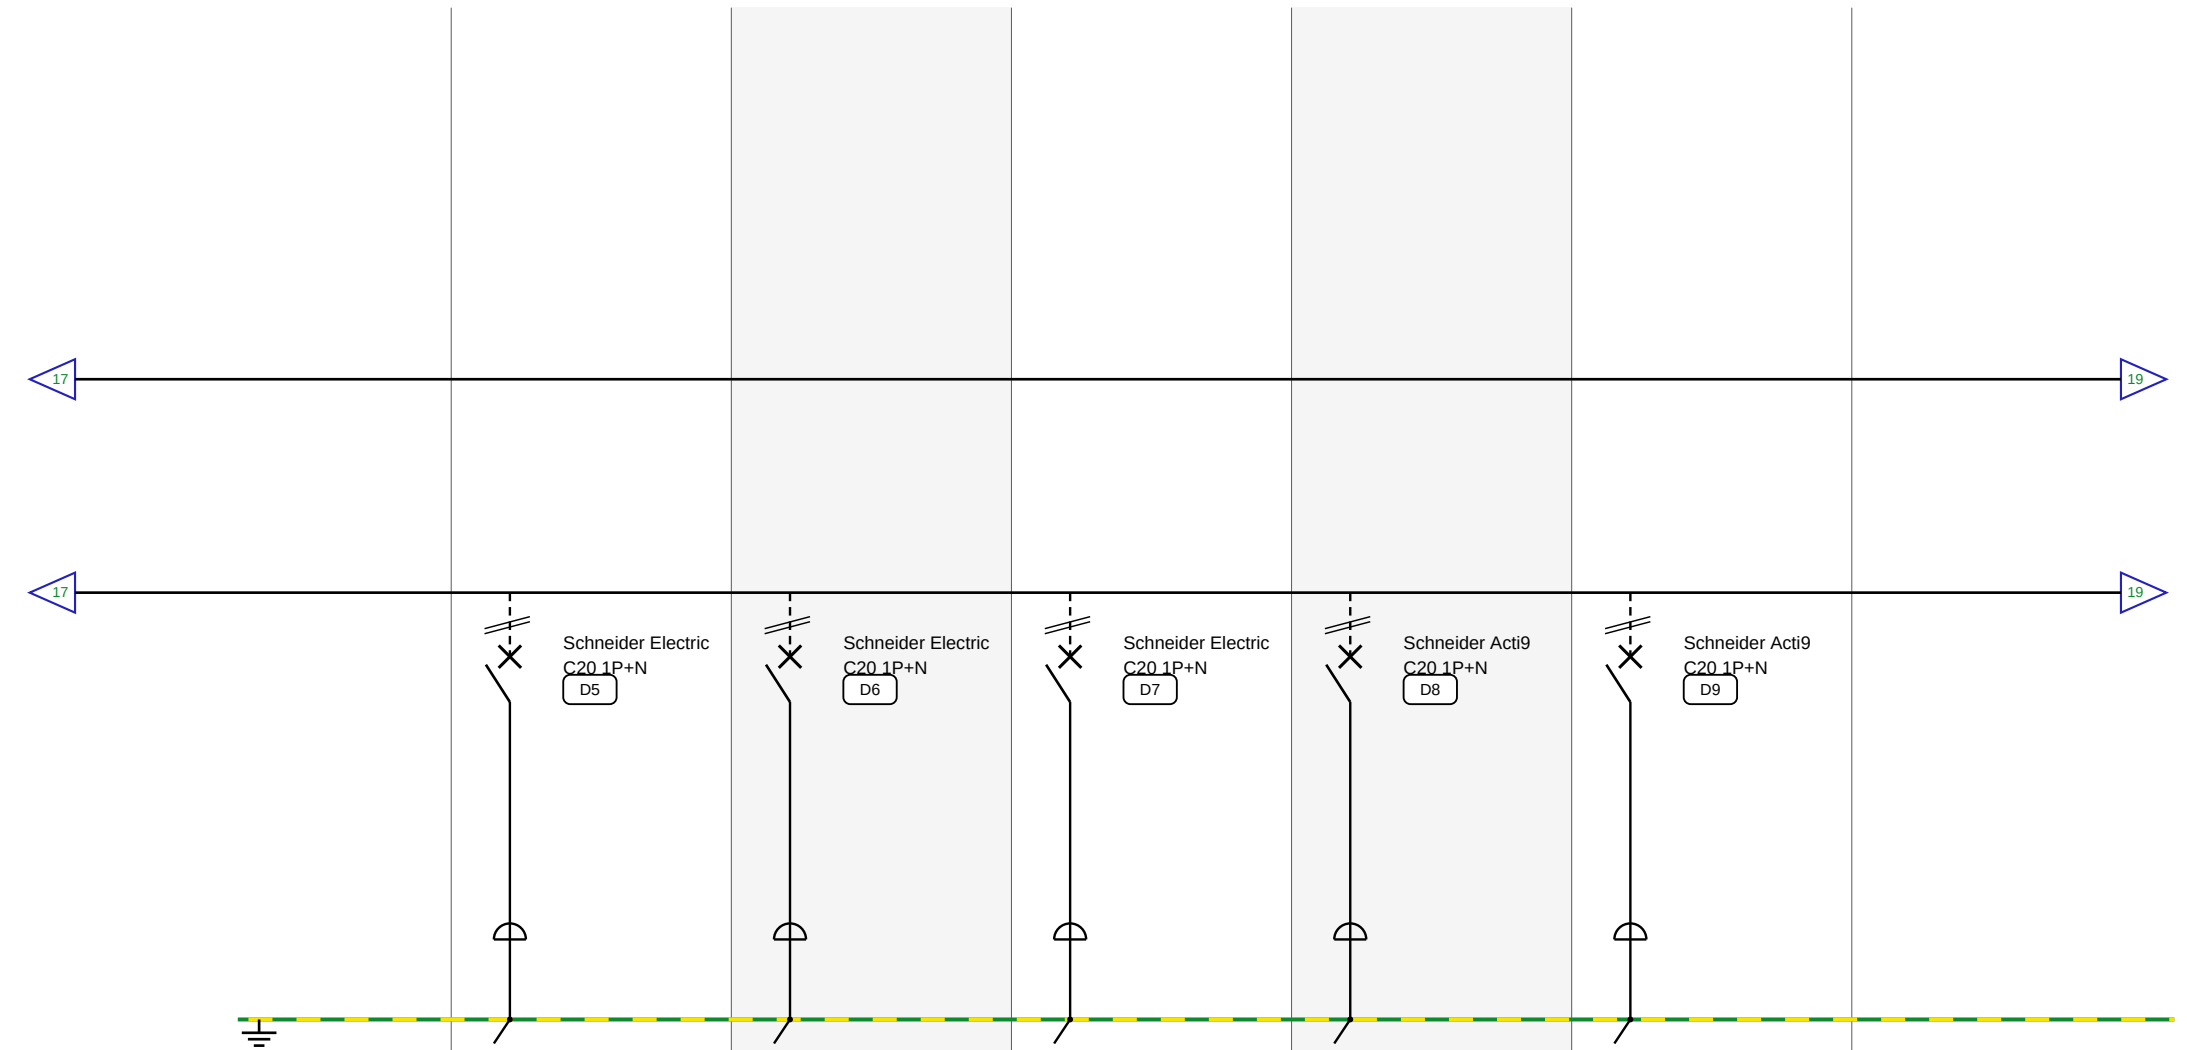

Identification du circuit	D5	D6	D7	D8	D9
Désignation	PC 220 V	PC 220 V	PC 220 V	PC1	PC2
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	Schneider Electric	Schneider Electric	Schneider Electric	Schneider Acti9	Schneider Acti9
Fiabilité du relevé	Probable	Probable	Probable	Probable	Probable

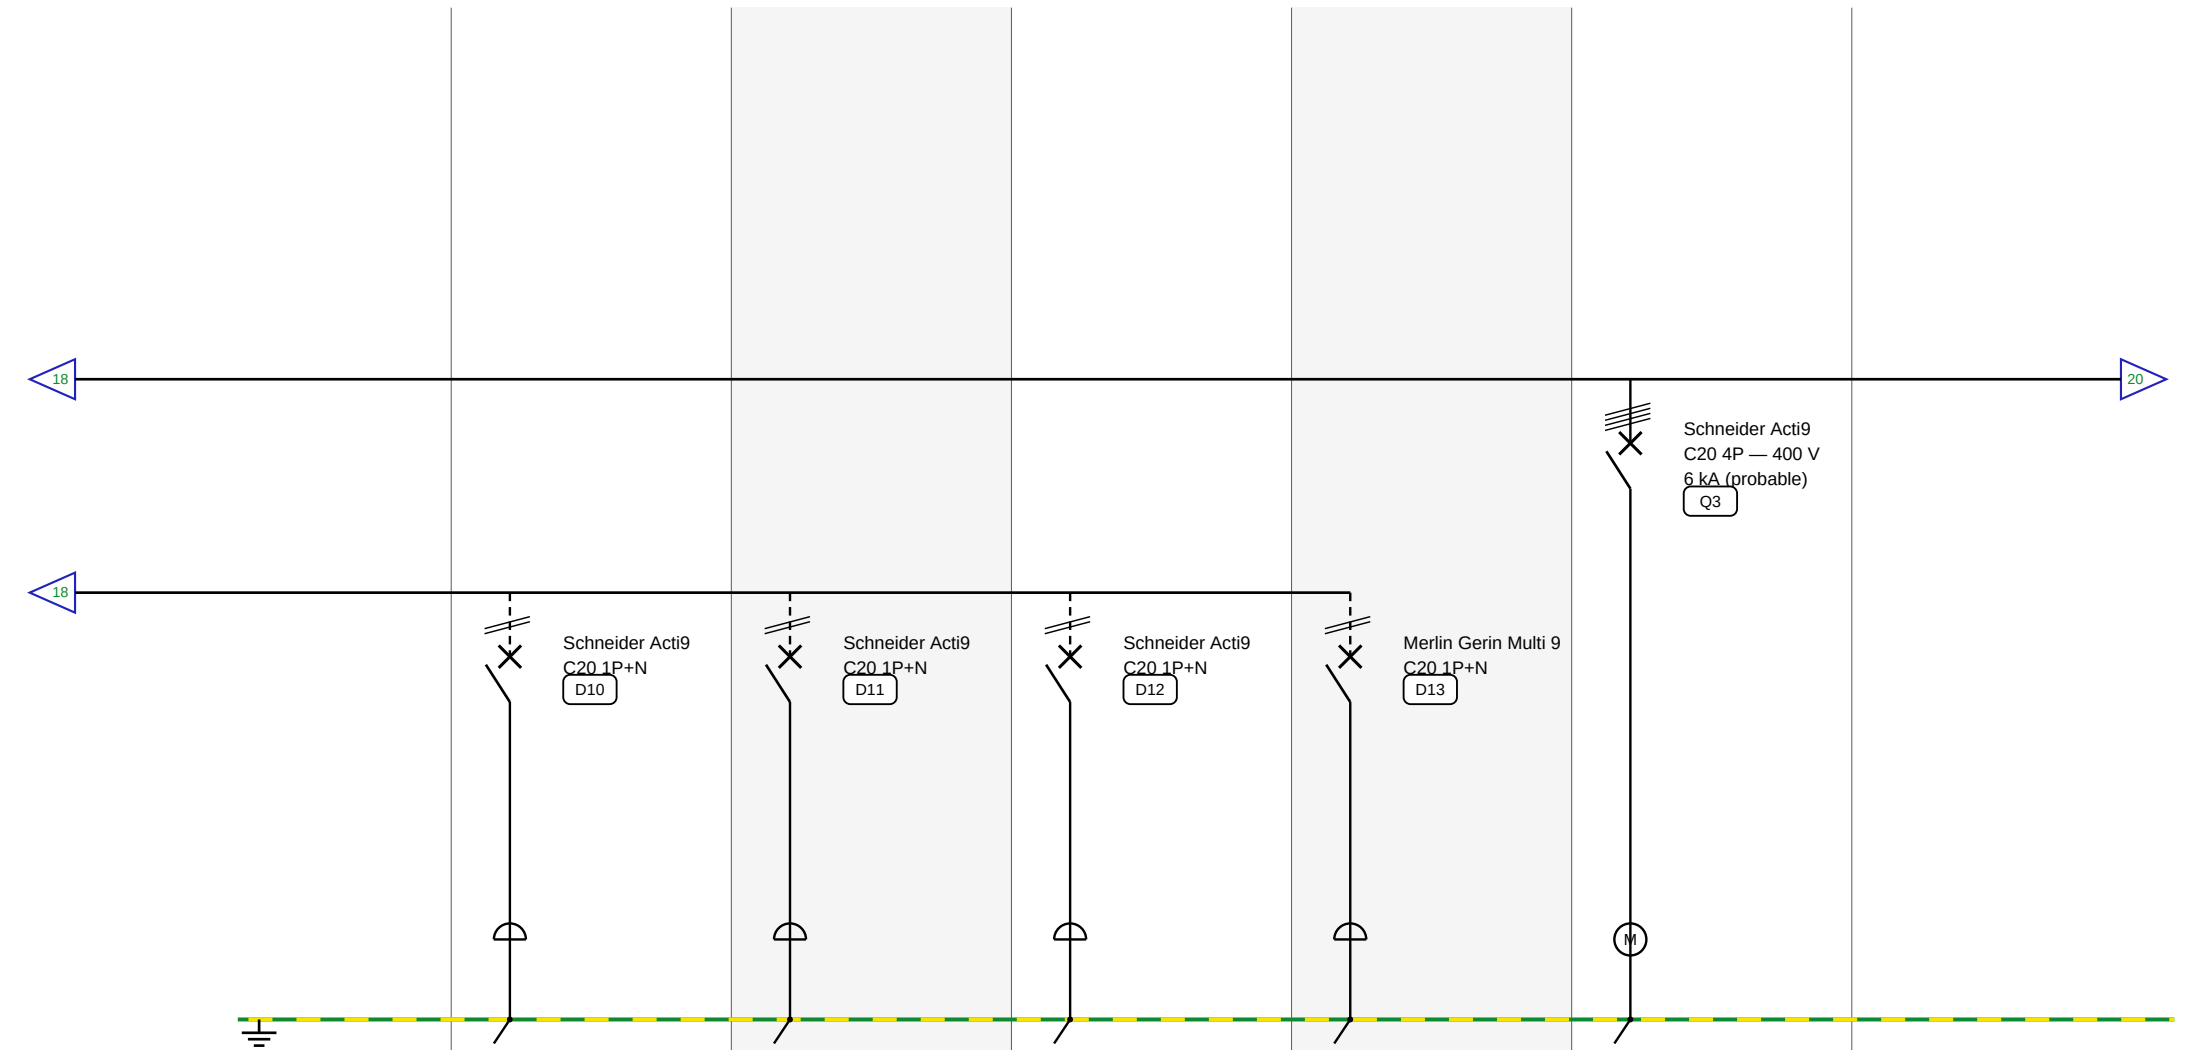

Identification du circuit	D10	D11	D12	D13	Q3
Désignation	PC3	PC4	PC5	PC6	Général rideau
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	Schneider Acti9	Schneider Acti9	Schneider Acti9	Merlin Gerin Multi 9	Schneider Acti9
Fiabilité du relevé	Probable	Probable	Probable	Probable	Probable

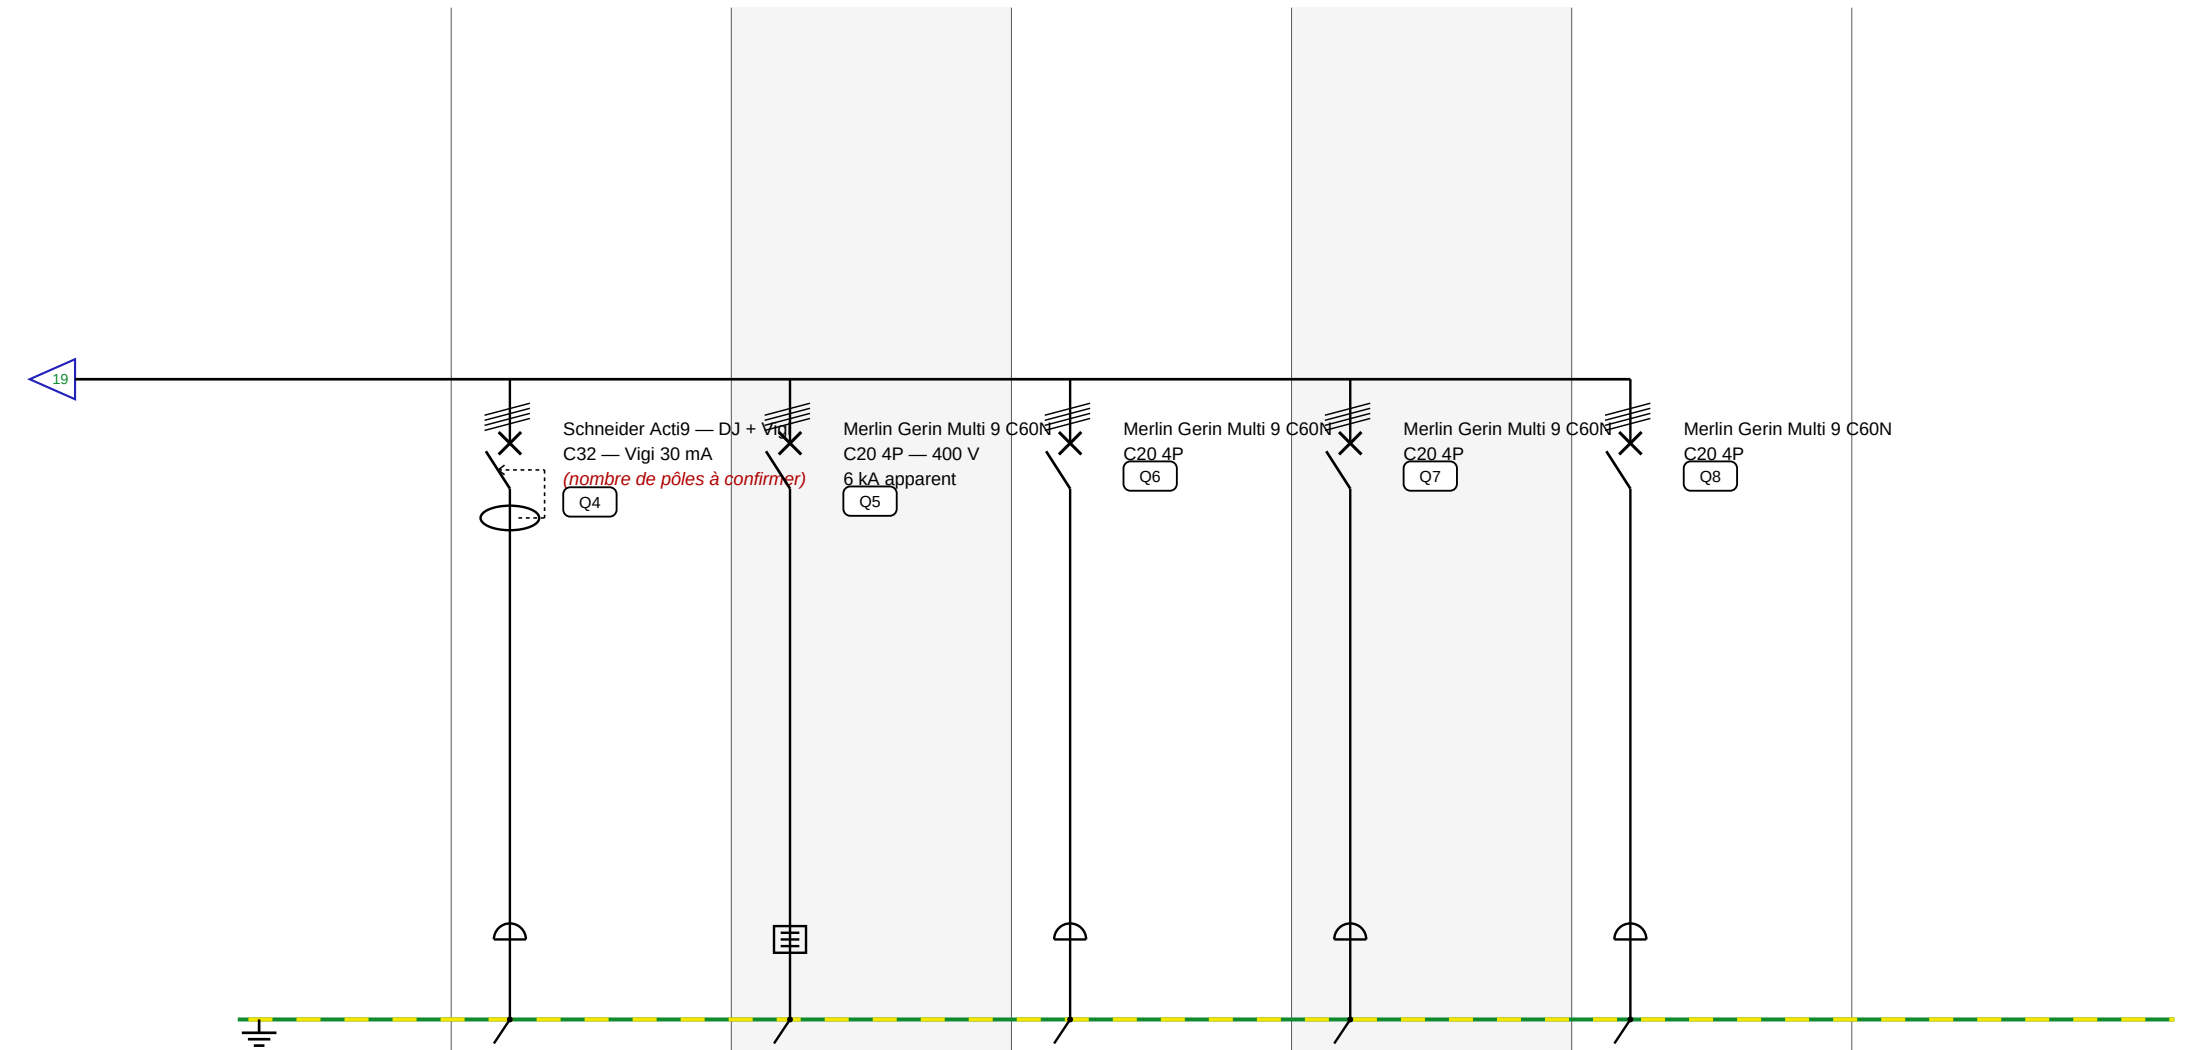

Identification du circuit	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Désignation	PC 32 A	Cumulus	PC 380 V	PC 380 V	PC 380 V
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	Schneider Acti9	Merlin Gerin Multi 9 C60N	Merlin Gerin Multi 9 C60N	Merlin Gerin Multi 9 C60N	Merlin Gerin Multi 9 C60N
Fiabilité du relevé	À confirmer	Probable	Probable	Probable	Probable


- Légende
- Q- Dispositifs de protection
 - I- Interrupteurs
 - X- Autres appareils
 - ⊕ Tableau raccordé aux borniers
 - - - Liaison probable — à confirmer sur site
- Rouge : donnée non confirmée par le relevé

TD ÉTABLI

TD établi — « COFFRET ÉTABLI »


- Enveloppe : Coffret modulaire blanc
Schneider, 1 rangée
- Réseau : Triphasé — circuits tri et mono
- Différentiel : Aucun différentiel visible dans le coffret
- Coupure locale : Non visible

- Observations
- Origine, protection amont et protection différentielle du TD établi à confirmer.

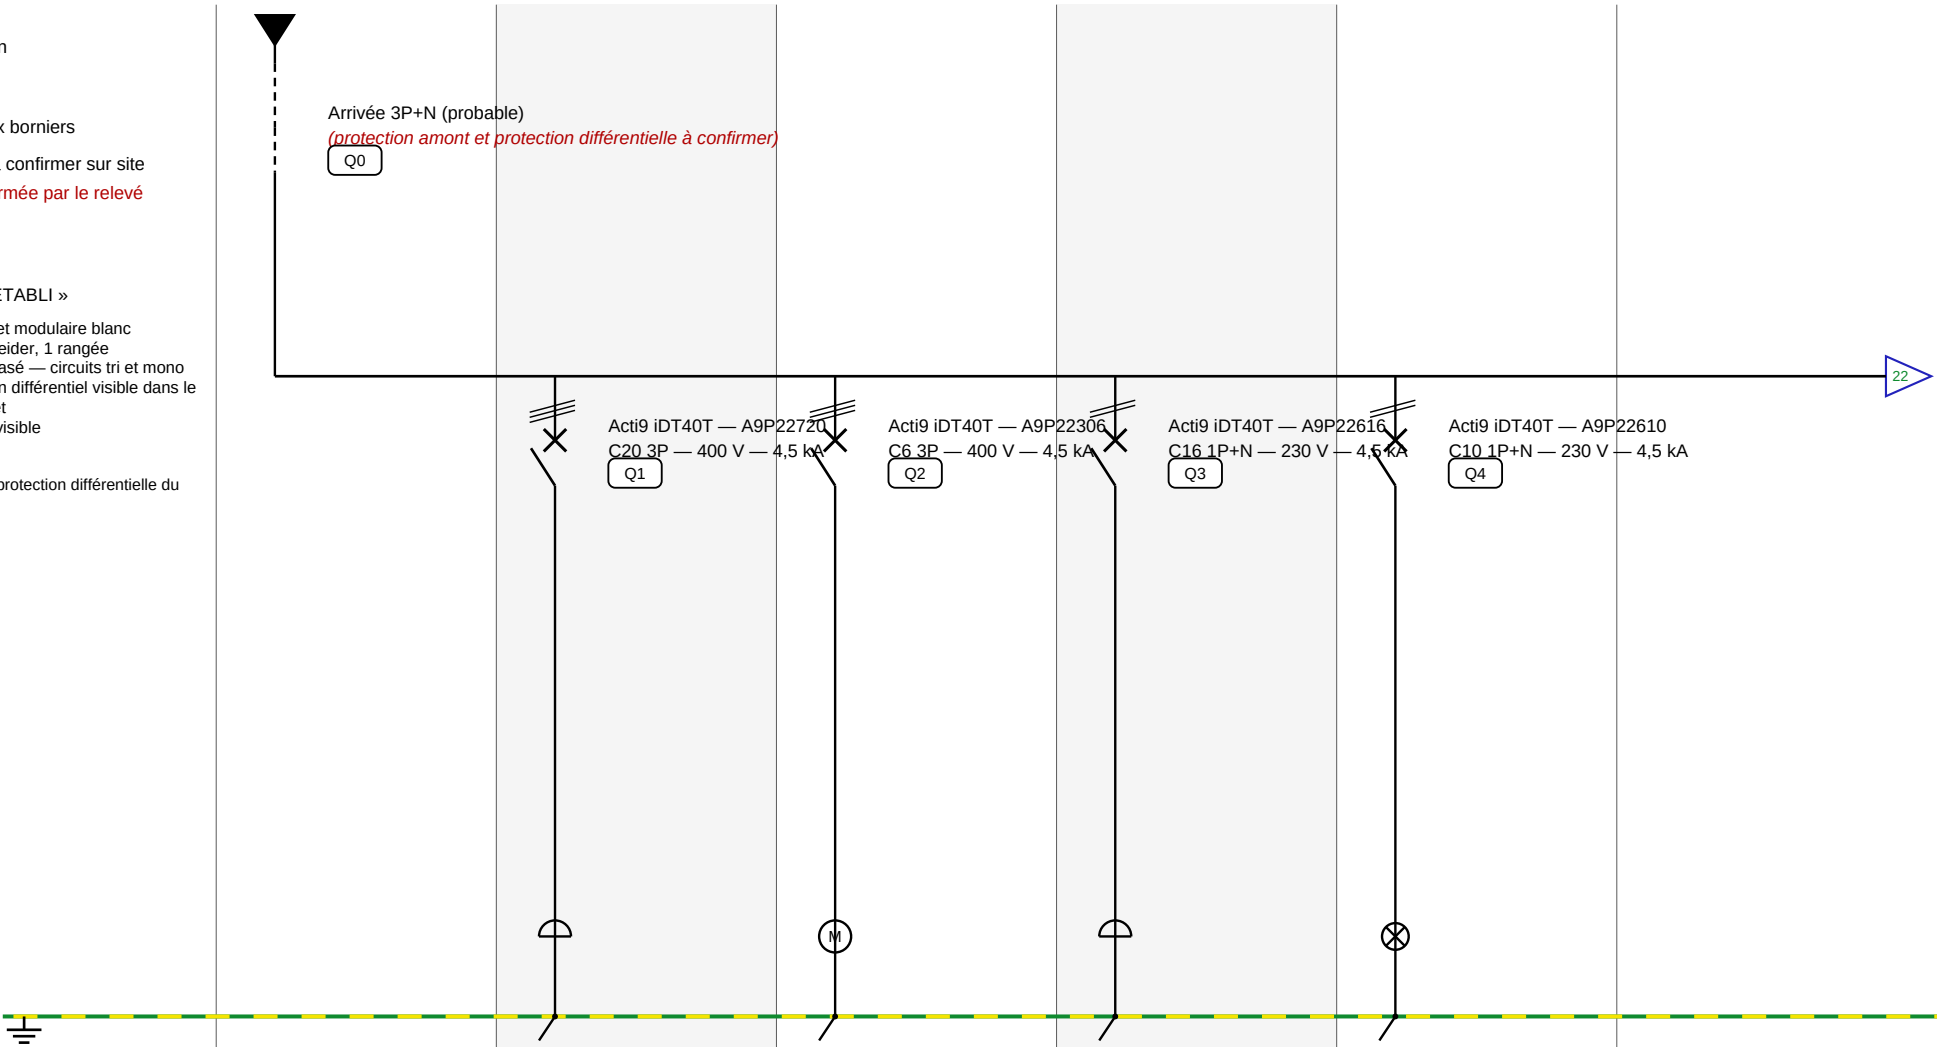

Identification du circuit	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4
Désignation	Arrivée coffret établi	PC triphasée	Colonne	PC monophasée	Éclairage
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	—	Acti9 iDT40T	Acti9 iDT40T	Acti9 iDT40T	Acti9 iDT40T
Fiabilité du relevé	À confirmer	Confirmé	Confirmé	Confirmé	Confirmé

RELEVÉ DE L'ÉTAT EXISTANT	Relevé tableaux électriques — état existant	TD établi — « COFFRET ÉTABLI »	Version: 1.0	31.08.2026 (DD.MM.YYYY)	21 / 26
Schéma unifilaire — sans étude de conformité ni dimensionnement					

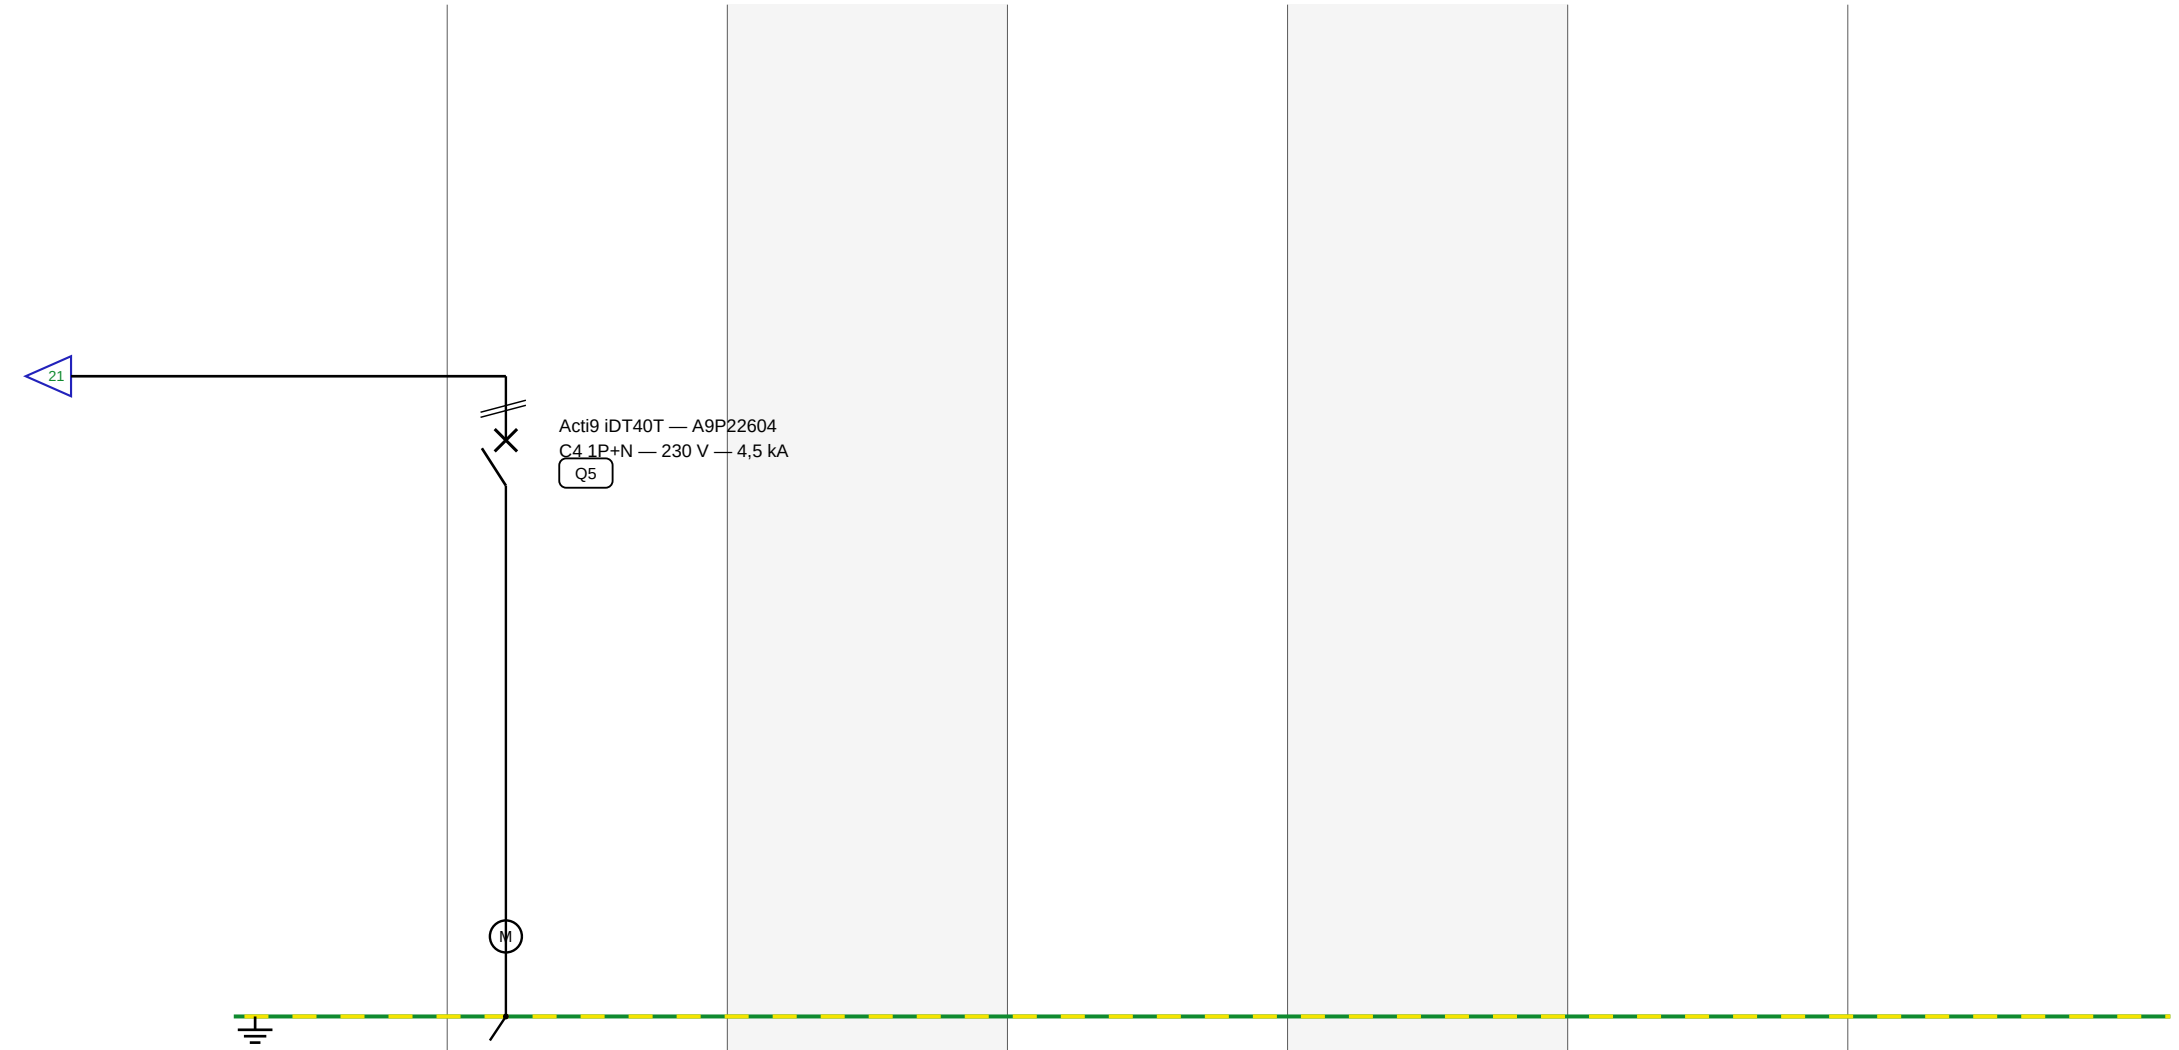

Identification du circuit	Q5				
Désignation	Touret				
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	Acti9 iDT40T				
Fiabilité du relevé	Confirmé				

RELEVÉ DE L'ÉTAT EXISTANT Schéma unifilaire — sans étude de conformité ni dimensionnement	Relevé tableaux électriques — état existant	TD établi — « COFFRET ÉTABLI »	Version: 1.0	31.08.2026 (DD.MM.YYYY)	22 / 26
--	---	--------------------------------	--------------	----------------------------	---------

- Légende
- Q- Dispositifs de protection
 - I- Interrupteurs
 - X- Autres appareils
 - ⊕ Tableau raccordé aux borniers
 - - - Liaison probable — à confirmer sur site
- Rouge : donnée non confirmée par le relevé

TD BAIE INFO


TD 138601-ELE-ARDV-0003 — baie informatique + onduleur

Enveloppe : Armoire métallique murale
Installateur : BD Bobineau
Zones : Circuits normaux et circuits ondulés
Réseau : Monophasé 230 V (2P apparents)

Observations


- Séparation exacte normal / ondulé à confirmer.
- Plaque signalétique et puissance de l'onduleur non relevées.

Sécurité — les circuits ondulés peuvent rester sous tension après coupure du général du coffret.
Consigner et vérifier avant toute intervention.

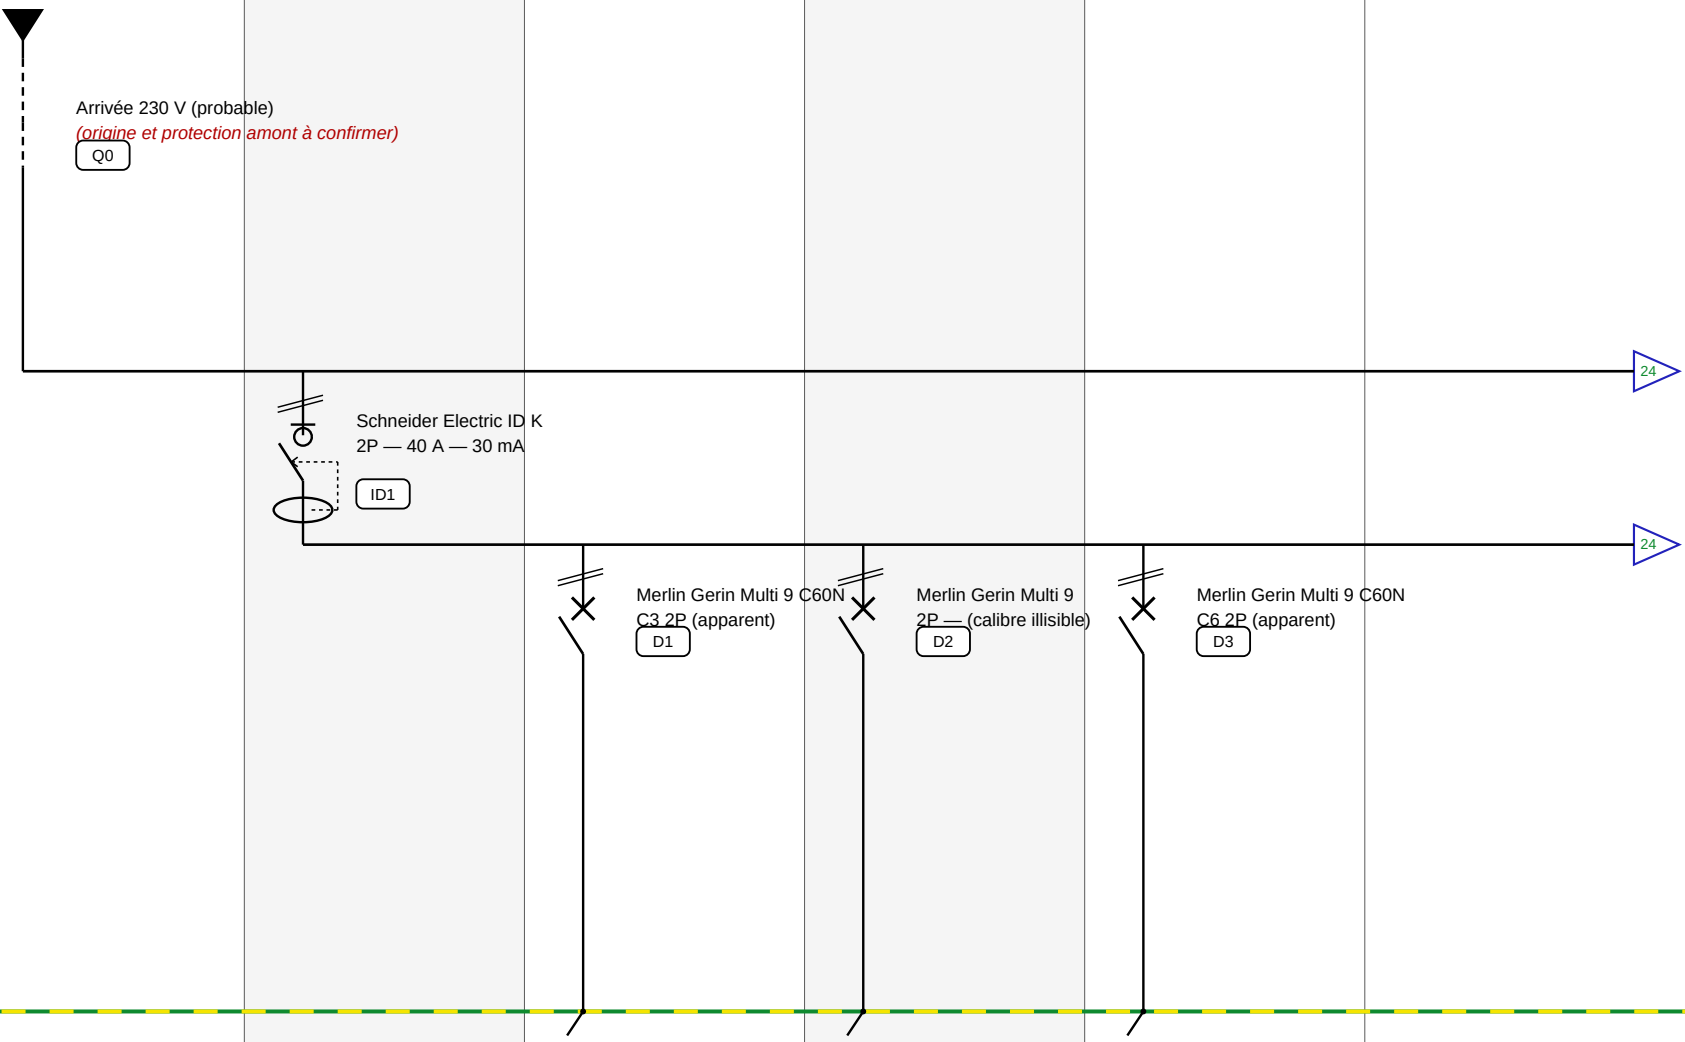


Identification du circuit	Q0	ID1	D1	D2	D3
Désignation	Arrivée baie informatique	Général armoire	Intrusion / chargeur	Autocom / téléphone	Réserve
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	—	Schneider ID K	Merlin Gerin Multi 9 C60N	Merlin Gerin Multi 9	Merlin Gerin Multi 9 C60N
Fiabilité du relevé	À confirmer	Probable	Probable	À confirmer	Probable

RELEVÉ DE L'ÉTAT EXISTANT Schéma unifilaire — sans étude de conformité ni dimensionnement	Relevé tableaux électriques — état existant	TD 138601-ELE-ARDV-0003 — baie informatique + onduleur	Version: 1.0	31.08.2026 (DD.MM.YYYY)	23 / 26
---	---	--	--------------	----------------------------	---------

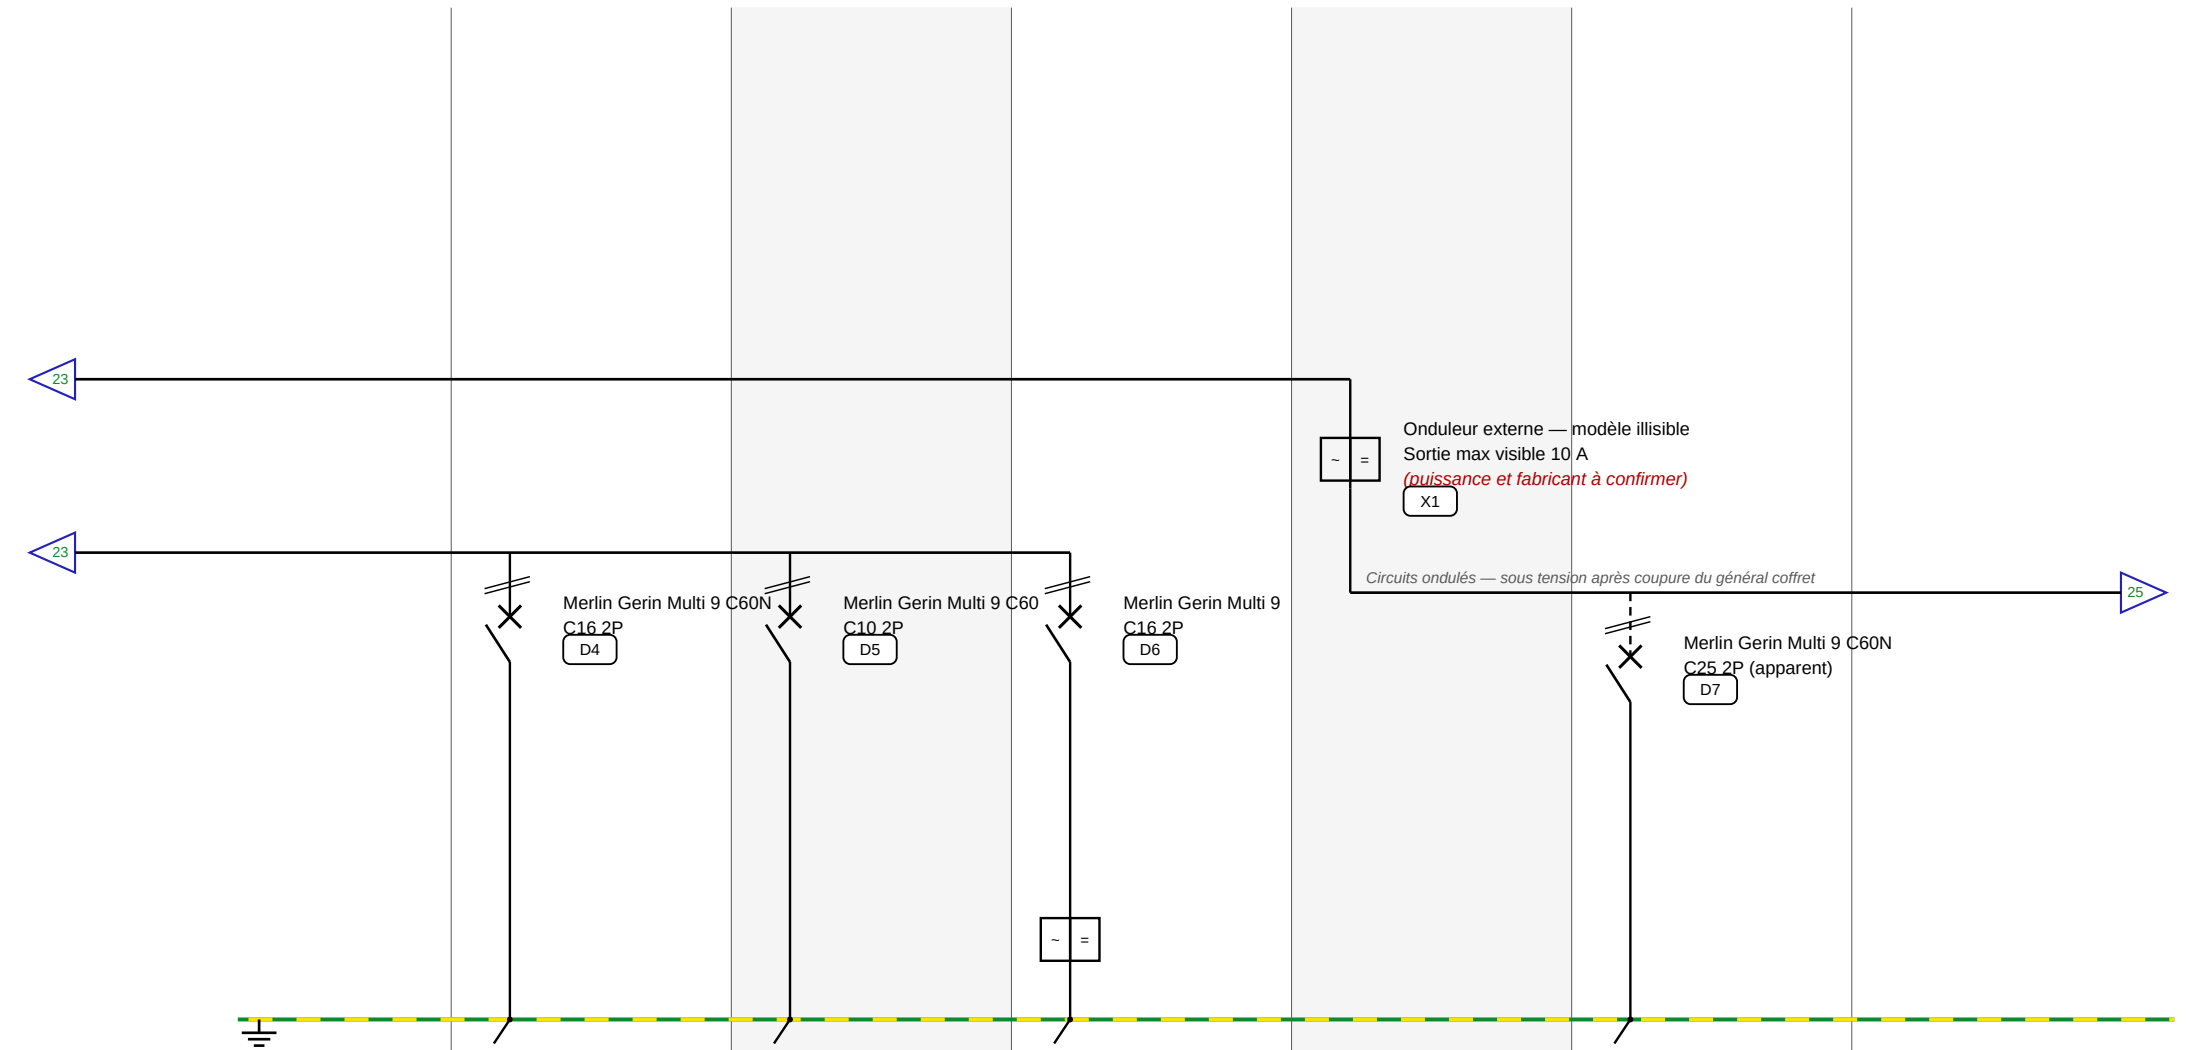

Identification du circuit	D4	D5	D6	X1	D7
Désignation	Chargeur	Modem	Coffret PC onduleur	Onduleur + bypass	Réserve ondulée
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	Merlin Gerin Multi 9 C60N	Merlin Gerin Multi 9 C60	Merlin Gerin Multi 9	Non identifié	Merlin Gerin Multi 9 C60N
Fiabilité du relevé	Probable	Probable	Probable	À confirmer	Probable

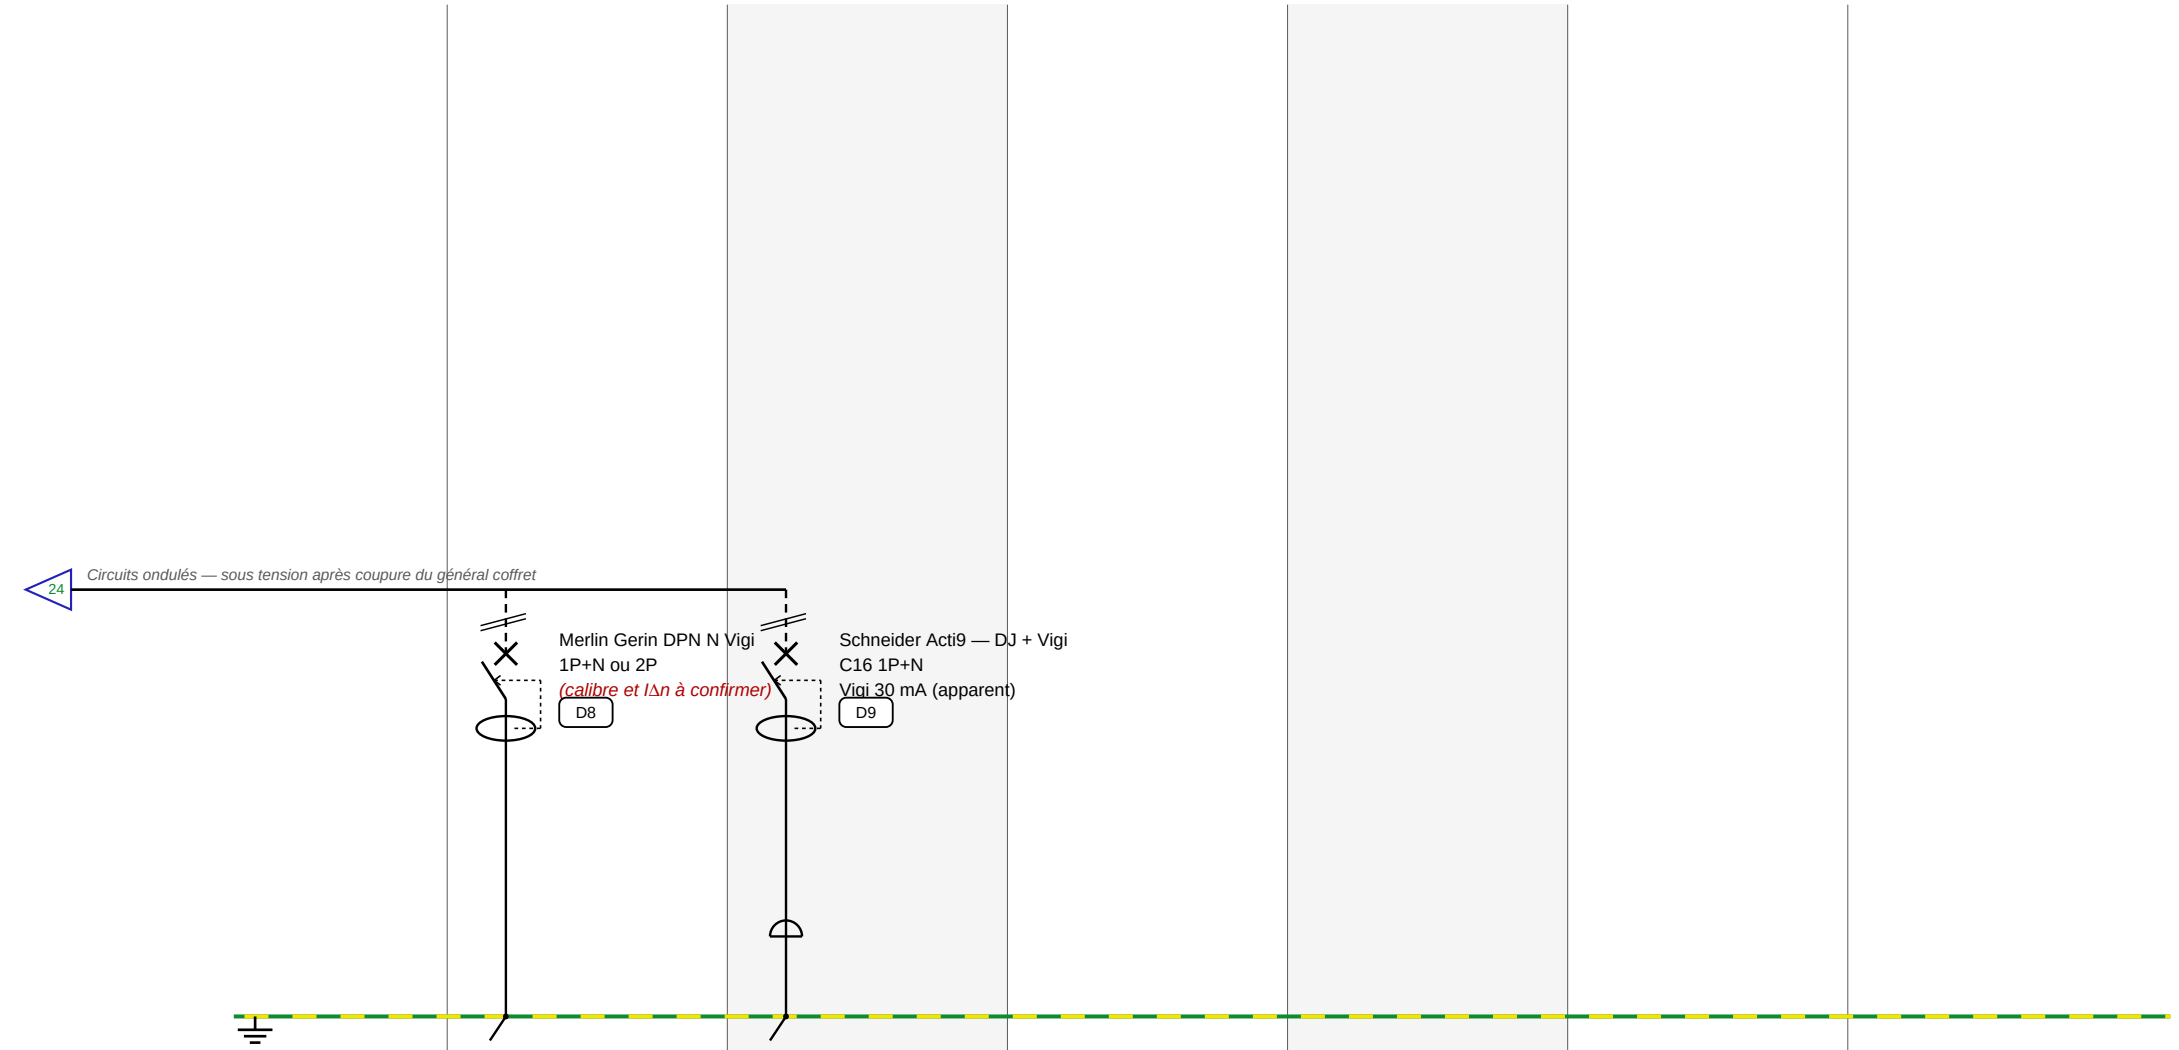

Identification du circuit	D8	D9			
Désignation	Baie de brassage — départ ondulé	Baie PC — normal			
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					
Gamme relevée	Merlin Gerin DPN N Vigi	Schneider Acti9			
Fiabilité du relevé	À confirmer	Probable			

DONNÉES RESTANT À CONFIRMER AVANT SCHÉMA DÉFINITIF

Points à lever sur site : tant qu'ils ne le sont pas, le schéma reste un relevé de l'existant.

- Cheminement réel et sections des câbles entre comptage, disjoncteur d'abonné, TGBT et tableaux divisionnaires.

■ Régime de neutre du site.

■ Icc réel aux différents tableaux.

■ Répartition exacte des circuits D1 à D17 sous DF1, DF2 et DF3 dans le TGBT.

■ Calibres, sensibilités et types différentiels illisibles sur les photographies.

■ Références exactes des anciens appareils Merlin Gerin.
- Protection amont et protection différentielle du TD établi.

■ Protection générale locale du TD rideaux hangar.

■ Fonction exacte des relais Finder et des temporisateurs du TD hangar.

■ Séparation exacte des circuits normaux et ondulés du tableau 138601-ELE-ARDV-0003.

■ Plaque signalétique et puissance de l'onduleur.

■ Rapport des transformateurs de courant du comptage.

Synthèse quantitative du relevé

Ensemble	Folios	Appareils relevés	Confirmé	Probable	À confirmer
Tableau Général Basse Tension	3 à 9	31	0	7	24
TD entrepôt — bâtiment annexe	10 à 13	18	7	8	3
TDS prises entrepôt — bâtiment annexe	14	5	4	0	1
TD rideaux hangar — bâtiment annexe	15	4	0	4	0
TD hangar — bâtiment annexe	16 à 20	25	0	20	5
TD établi — « COFFRET ÉTABLI »	21 à 22	6	5	0	1
TD 138601-ELE-ARDV-0003 — baie informatique + onduleur	23 à 25	12	0	8	4
TOTAL		101	16	47	38

Consigne de dessin appliquée dans ce dossier

- Toute donnée non confirmée est annotée « à confirmer » et imprimée en rouge.
- Toute liaison seulement probable est tracée en pointillé.
- La ligne « Fiabilité du relevé » du tableau des circuits porte le niveau Confirmé / Probable / À confirmer de chaque départ.
- Les lignes Section, Type, Longueur et Matière de câble sont volontairement laissées vides : ces données ne sont pas relevables en photo.

RELEVÉ DE L'ÉTAT EXISTANT Schéma unifilaire — sans étude de conformité ni dimensionnement	Relevé tableaux électriques — état existant	Réserves et données à confirmer	Version: 1.0	31.08.2026 (DD.MM.YYYY)	26 / 26
---	---	---------------------------------	--------------	----------------------------	---------
